

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PEKERJAAN ELEKTRIKAL									
1	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu Sorot - Logo 4000k	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Solid 3000k	1.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Pattern GRC 3000k 40 Mtr @10 Mtr	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Downlight Outbow Spot 5 Watt Fasad Kisi-kisi 3000k 3 - 8 meter	0.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	3000kPengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 60 Cm	0.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 40 Cm 33000k	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pengadaan dan pemasangan traytek ladder	0.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pengadaan dan pemasangan siku penggantung 4x4 cm	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Elektrikal									
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERIKUT KELENGKAPANNYA									
1	Pogadaan dan pemasangan Lampu Sorot	0.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip Selang - Fasad Solid + Besi Siku 2mm	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Stri Selang - Fasad Pattern @10 Mtr	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fasad Kisi-kisi	0.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 60 Cm	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 40 Cm	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Panel Penerangan Fasad	0.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan berikut kelengkapannya									
PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Header Pipa PVC AW dia 4"	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC AW dia 1"	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Gate Valve dia 50	0.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Roof Tank Kap 1500 Ltr	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pompa Tansfer	0.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pompa Sirkulasi + Pengkabelan dan Perpipaan	0.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Filter + Carbon Filter	0.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Ground Tank 1m3	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bersih									
PEKERJAAN PIPA AIR BEKAS									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	0.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
PEKERJAAN PIPA AIR HUJAN									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"		0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pekerjaan perbalkan kemiringan profilan air hujan		0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
GRAND TOTAL		8.68							

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN SMK

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN	
		(%)	Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot		
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
PENYIAPAN RKK										
	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	0.01	0.11%	0.000	0.00%	-	0.11%	0.000		
1	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja									
	Penyusunan Formulir									
Total Pekerjaan Penyusunan RKK										
ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI										
		0.01	100.00%	0.011	0.00%	-	100.00%	0.011		
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)									
2	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)		0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)		0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
	4 Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	0.07	100.00%	0.068	0.00%	-	100.00%	0.068		
	5 Rompi Keselamatan (Safety Vost)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016		
Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri										
ASURANSI										
		0.34	0.00%		0.00%	-	0.00%	-		
1	Asuransi									
Total Asuransi										
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN										
		0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007		
1	Peralatan PJK (Kotak PJK, Obat Luka, dll)									
2	Peralatan Pengasapan (Fogging)		0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan										
RAMBU-RAMBU										
		0.01	0.00%	-	0.00%		0.00%	-		
1	Rambu Petunjuk									
-	Rambu Larangan		0.01	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	
-	Rambu Peringatan		0.01	0.00%		0.00%	-	0.00%	-	
-	Rambu Kewajiban	0.01	0.00%		0.00%	-	0.00%	-		
-	Rambu Informasi	0.01	0.00%		0.00%		0.00%			
Total Rambu-Rambu										
LAIN-LAIN										
		0.02	100.00%	0.018	0.00%	-	100.00%	0.018		
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)									
2	Bendera K3		0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Lain-Lain										
Sub Total		0.52		0.13				0.13		

Kingsford
ORDER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



LAPORAN MINGGU KE-4



**PROYEK PEMBUATAN FASADE GEDUNG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI JAKARTA
Jalan Petojo Utara VII no 8 - Jakarta**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Periode : 26 – 01 Februari 2026

dilaporkan :
KONSULTAN PENGAWAS



PT. MITRA PANCA KONSULTINDO
Construction Management & Quantity Surveyor

LAPORAN MINGGUAN

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Lokasi : Jl. Petojo Utara VII No.8, RT.15/RW.3, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
Periode : 26 Januari-01 Februari
Tanggal : 31 Januari 2026



I. Progress Pekerjaan .

No	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	Progress Pekerjaan (%)		
			Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu ini
1	SMKK	0,58%	22,94%	0,00%	22,94%
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17,81%	0,00%	0,00%	0,00%
3	PEKERJAAN FASAD	73,03%	2,58%	0,60%	3,18%
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Realisasi Progress Pekerjaan		2,46%	2,02%	0,44%	2,46%
Rencana Progress Pekerjaan		100,00%	0,00%	0,52%	1,36%
Deviasi Progress		97,54%	2,02%	-0,09%	1,10%
Target Prestasi Minggu Depan		2,41%			

II. Waktu Pelaksanaan .

Waktu Pelaksanaan : hari
Waktu Berjalan : hari
Sisa Waktu : hari

III. Laporan Cuaca

Tanggal :	26	27	28	29	30	31	1			
Pagi										
Siang										
Sore										
Malam										

: Cerah
: Mendung
: Gerimis
: Hujan

IV. Permasalahan Pelaksanaan & Penyelesaian .

Permasalahan	Penyelesaian

V. Tenaga Kerja

Kontraktor			Sub Kontraktor / Vendor			Owner & MK		
No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah
1	Staff Kontraktor	1rang	1		Orang	1	Staff Owner	Orang
2	Pelaksana	1rang	2		Orang	2	Staff MK	1rang
3	Pelaksana K3	1rang	3		Orang	3		Orang
4	Tenaga helper	8rang	4		Orang	4		Orang
5	Mandor	2rang	5		Orang	5		Orang
6								

Dilaporkan :



Nama : M.Adhitya Iswadi Putra

Jabatan : Staff MK

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 1



Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 26 Januari-01 Februari

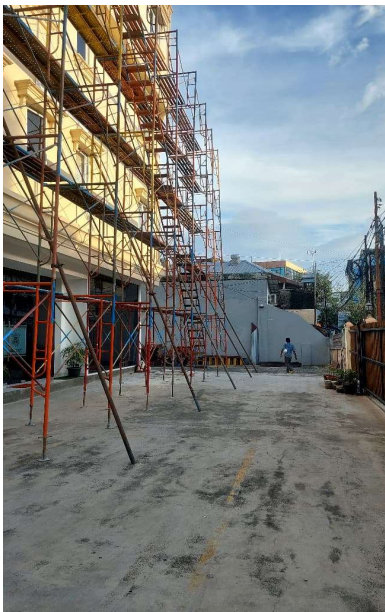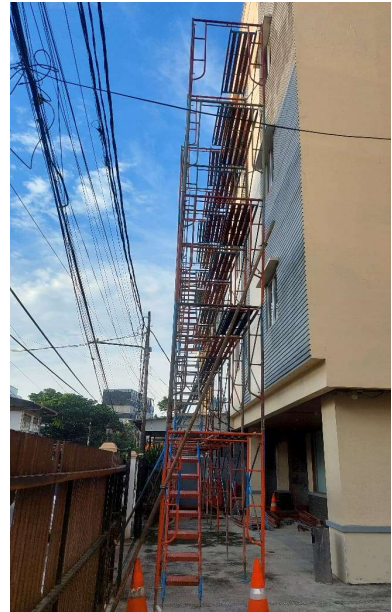

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 2

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 26 Januari-01 Februari

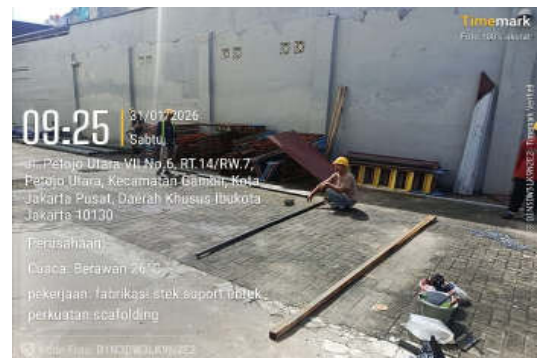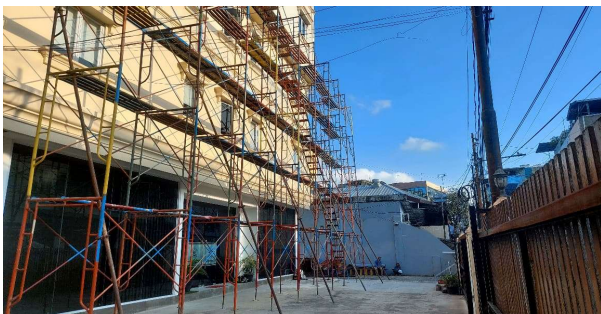

KONTRAKTOR :  CV. ALIF PUTERA PRATAMA General Contractor Jl. Dharma No. 21/B, II Samarinda		LAPORAN PROGRES MINGGUAN Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.	Owner KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN DIREKTORAT LOGISTIK / UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KONTRAKTOR : CV. ALIF PUTERA PRATAMA MANAJEMEN KONTRUKSI : PT. MITRA PANCA KONSULTINDO NILAI KONTRAK : Rp. 4.058.900.000,00 WAKTU PELAKSANAAN : 180 Hari Kalender	Tanggal : 28 Januari s/d 01 Februari 2020 Minggu Ke : 4 (empat) Hari Ke : 25 Biasa Hari : 155		

NO	PEKERJAAN	BOBOT (%)	3 D MINGGU LALU		MINGGU INI		3 D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	SHOX	0.98	22.84%	0.133	0.05%	0.000	22.90%	0.133	
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17.81	0.00%		0.00%		0.00%		
3	PEKERJAAN FASAD	73.03	2.50%	1.883	0.00%	0.440	3.18%	2.324	
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8.58	0.00%		0.00%		0.00%		
GRAND TOTAL		100.00		2.02		0.44		2.46	

Mengetahui :
OWNER
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Diperiksa & Disetujui Oleh
MANAJEMEN KONSULTINDO
PT. MITRA PANCA KONSULTINDO

Jakarta, 01 Februari 2020
Dibuat Oleh
KONTRAKTOR
CV. ALIF PUTERA PRATAMA
Yulhas
Project Manager

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pekerjaan Persiapan dan Mobilisasi	0.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pembongkaran Dinding Pagar	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pembongkaran Pagar	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Persiapan									
PEKERJAAN POS JAGA									
1	Penggalan Pondasi Garis	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Urugan Kembali Bekas Ontlan	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pasir Urug	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Penghamparan Timbunan	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pondasi Batu Belah 1 SP : 4 PP	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pekerjaan Stiof 15x30								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Stiof	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Kolom Praktis								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Kolom	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Balok								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Balok	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
10	Pekerjaan Plat Beton								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Plat	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
11	Pekerjaan Atap								
-	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan 0,8 x 0,3 x 0,76 + Rangka Reng 0,7 x 0,4 x 0,45	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pekerjaan Atap Spandek Warna 0,4	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pekerjaan Flashing Atap	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
12	Pekerjaan Dinding								
-	Pemasangan Bata Ringan 10 cm	0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Acian Bangunan T.2mm	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
13	Pekerjaan Plafond								
-	Rangka Plafond Rangka Besi Hollow (20.40.2 + 40.40.2) 60 x 60 cm	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pemasangan Penutup Plafond Gypsum	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
14	Pekerjaan Lantai								
-	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Dinding Fin. Batu Alam	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
15	Pekerjaan Pintu Jendela								
-	Pintu Swing Uk. 90x205	0.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Jendela Geser Uk. 220x100	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
16	Pekerjaan Pengcatan								
-	Pengcatan Dinding Luar (Eksterior) Kamprot Putih	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pengcatan Dinding Dalam (Interior) Cat Putih	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pengcatan Plafond Warna Putih	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pos Jaga									

		S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	
PEKERJAAN KANOPI					
1 Pekerjaan Kanopi Parkir					
- Hollow Galvanis 4 x 4 Uk. 1,2 mm	0.07	0.00%	-	0.00%	-
- Atap Solar Flat 3 mm	0.31	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Kanopi					
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL					
1 Pekerjaan Penarikan Instalasi Kabel Lampu					
- Lampu Downlight 10 watt	0.01	0.00%	-	0.00%	-
- Lampu Hias Tiang Taman	0.06	0.00%	-	0.00%	-
2 Pekerjaan Pemasangan Lampu					
- Lampu Downlight 10 watt	0.00	0.00%	-	0.00%	-
- Lampu Hias Tiang Taman	0.04	0.00%	-	0.00%	-
- Lampu Dinding Taman	0.03	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal					
GRAND TOTAL	17.81				

6

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN FASAD

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
				Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
				(%)						
PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Shop drawings and As Built Drawing	Ls	0.05	0.11%	0.003	3.00%	0.002	10.00%	0.005	
2	Debris disposal	Ls	0.14	50.00%	0.008	0.00%	-	50.00%	0.008	
3	Transportation & Mobilisation	Ls	0.27	35.00%	0.000	5.00%	0.014	40.00%	0.100	
4	Peralatan dan perlengkapan kerja (Skafolding dll)	Ls	2.87	30.00%	0.001	5.00%	0.144	35.00%	1.005	
Total Pekerjaan Pendahuluan										
PEKERJAAN PEMBONGKARAN										
1	Pembongkaran Dinding	m2	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pembongkaran Profil Luar	ls	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pembongkaran Topl Beton	m2	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pembongkaran										
PEKERJAAN FASAD										
1	Rangka Utama Kremona									
	- Hollow Galvanis 40x80x2 mm	m'	1.44	15.00%	0.210	5.00%	0.072	20.00%	0.288	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	3.15	15.00%	0.473	5.00%	0.168	20.00%	0.631	
	- Overstek Baja UNP 150x75x5,1 mm	m'	0.96	15.00%	0.144	5.00%	0.048	20.00%	0.162	
	- Dynabolt M12 x75 mm	bh	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Fasad ACP Solid Dark Grey									
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm Grey Grey	m2	12.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm China Grey	m2	6.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Fasad ACP Kisi-kisi Red									
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm Red	m2	20.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 20x40x2 mm	m'	4.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Fasad ACP Bak Tanam									
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm China Grey	m2	1.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Fasad ACP Pattern									
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm Yellow	m2	1.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	0.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Signage Logo & Text UNHAS Uk. 2920x1890 mm									
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Signage Logo & Text HADIN Uk. 3200x1710 mm									
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Finishing									
	- Pekerjaan Pengecatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	3.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pekerjaan Pengecatan Signage Logo UNHAS	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pekerjaan Pengecatan Signage Logo HADIN	m2	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Kanopi & Plafon WPC Bar									
	- Solar Tuff Dark Grey Transparan T. 8 mm	m2	0.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x80x1,4 mm	m'	0.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x1,4 mm	m'	0.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- WPC Bar Click On 60x90 mm	m'	5.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Tali Sling M20 (Ke Balok Gedung Eksisting)	m'	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pengecatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Fasad										
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA										
1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Poer	m3	0.02	0.00%	-	15.00%	0.003	15.00%	0.003	
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	m3	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P1)									

9.

Bekisting Poer Plat	m2	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5 Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P2)									
Bekisting Poer Plat	m2	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6 Pekerjaan Kolom Pedestal (20x20)									
Bekisting Kolom	m2	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7 Pekerjaan Struktur Baja									
WF 150 x 75 x 6 x 7	kg	1.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Base Plate t=12 mm	kg	0.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Baut M16 + 1 Nut + 2 Washer	Bh	0.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Angkur Bolt M16	Bh	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Struktur Baja									
GRAND TOTAL		73.03		1.88		0.44		2.32	

Dr.

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PEKERJAAN ELEKTRIKAL									
1	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu Sorot - Logo 4000k	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Solid 3000k	1.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Pattern GRC 3000k 40 Mtr @10 Mtr	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Downlight Outbow Spot 5 Watt Fasad Kisi-kisi 3000k 3 - 8 meter	0.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	3000kPengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 60 Cm	0.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 40 Cm 33000k	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pengadaan dan pemasangan traytek ladder	0.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pengadaan dan pemasangan siku penggantung 4x4 cm	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Elektrikal									
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERIKUT KELENGKAPANNYA									
1	Pegadaan dan pemasangan Lampu Sorot	0.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip Selang - Fasad Solid + Besi Siku 2mm	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Stri Selang - Fasad Pattern @10 Mtr	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fasad Kisi-kisi	0.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 60 Cm	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 40 Cm	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Panel Penerangan Fasad	0.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan berikut kelengkapannya									
PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Header Pipa PVC Aw dia 4"	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC AW dia 1"	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Gate Valve dia 50	0.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Roof Tank Kap 1500 Ltr	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pompa Tansfer	0.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pompa Sirkulasi + Pengkabelan dan Perpipaan	0.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Filter + Carbon Filter	0.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Ground Tank 1m3	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bersih									
PEKERJAAN PIPA AIR BEKAS									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	0.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
PEKERJAAN PIPA AIR HUJAN									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pekerjaan perbaiki kemiringan profilan air hujan	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
GRAND TOTAL		8.58		-		-		-	

47

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN SMK

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
PENYIAPAN RIKK									
	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	0.01	0.11%	0.000	0.00%	-	0.11%	0.000	
1	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja								
	Penyusunan Formulir								
	Total Pekerjaan Penyusunan RIKK								
ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI									
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0.01	100.00%	0.011	0.00%	-	100.00%	0.011	
2	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	0.07	100.00%	0.068	0.00%	-	100.00%	0.068	
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
	Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri								
ASURANSI									
1	Asuransi	0.34	0.00%		0.00%	-	0.00%		
	Total Asuransi								
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN									
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, dll)	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
2	Peralatan Pongasapan (Fogging)	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
	Total Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan								
RAMBU-RAMBU									
1	Rambu Petunjuk	0.01	0.00%		0.00%	-	0.00%		
-	Rambu Larangan	0.01	0.00%		0.00%	-	0.00%		
-	Rambu Peringatan	0.01	0.00%		0.00%	-	0.00%		
-	Rambu Kewajiban	0.01	0.00%		0.00%	-	0.00%		
-	Rambu Informasi	0.01	0.00%		0.00%	-	0.00%		
	Total Rambu-Rambu								
LAIN-LAIN									
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
2	Bendera K3	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
	Total Lain-Lain								
	Sub Total	0.52		0.13				0.13	

Handwritten signature

KURVA S

JADWAL PEKERJAAN

PEKERJAAN

LOKASI

TAHUN ANGGARAN

DURAS


Pembangunan Gedung Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDK) UNHAS
Jl. Petjo Utara VI No.1, RT 15/RW.3, Petjo Utara, Kecamatan Sembel, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10136

2020

100 hr

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	DURAS (Hari)	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				KET				
				Minggu ke-1				Minggu ke-2				Minggu ke-3				Minggu ke-4				Minggu ke-5				Minggu ke-6					Minggu ke-7			
				1-11	12-18	19-25	26-31	02-08	09-15	16-22	23-29	30-05	06-12	13-19	20-26	27-03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29-04	05-11						
1	PEKERJAAN GEDUNG																															
	PEKERJAAN RUMAH	0.01	1.00	0.0071																												
	ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI	0.12	1.00	0.1188																												
	ASURANSI	0.28	2.00		0.1913	0.1913																										
	FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KENDAHAN	0.01	1.00	0.0101																												
	PAKULAN/PAKUL	0.04	1.00	0.0404	0.0404	0.0404																										
	LANJUTAN	0.02	1.00	0.0202																												
2	PEKERJAAN HANGCAP DAN SOFTCAP																															
	PEKERJAAN PERAWAN	0.06	2.00					0.0406	0.0406	0.0406																						
	PEKERJAAN POS JAGA	2.11	0.00																													
	PEKERJAAN PAGAR	0.75	0.00																													
	PEKERJAAN LANSIAP	7.88	0.00																													
	PEKERJAAN KAWAT	0.38	2.00																													
	PEKERJAAN MENDAKUL DAN ELEKTROLA	0.14	0.00																													
3	PEKERJAAN PASAD																															
	PEKERJAAN PENCAKULAN	3.31	25.00	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008		
	PEKERJAAN PERMUKAAN	0.16	2.00					0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116		
	PEKERJAAN PASAD	00.47	20.00				0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374	0.0374		
	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA	2.03	0.00																													
4	PEKERJAAN ELEKTROLA DAN PLUMBING																															
	PEKERJAAN ELEKTROLA	3.87	0.00																													
	PEKERJAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERBUTU KENDAHAN/PAKUL	1.18	0.00																													
	PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH	2.84	0.00																													
	PEKERJAAN PIPA AIR BUKAL	0.72	0.00																													
	PEKERJAAN PIPA AIR KULAN	0.20	0.00																													
	BERSIH TERIMA																															
	TOTAL	100.00		0.2271	0.2113	0.2079	0.2021	0.2044	0.2057	0.2072	0.2085	0.2099	0.2108	0.2123	0.2137	0.2149	0.2160	0.2171	0.2182	0.2193	0.2204	0.2215	0.2226	0.2237	0.2248	0.2259	0.2270	0.2281	0.2292	0.2303		
	KUMULATIF			0.2271	0.4284	0.6363	0.8384	1.0428	1.2485	1.4557	1.6642	1.8741	2.0854	2.2981	2.5121	2.7273	2.9437	3.1612	3.3797	3.5992	3.8197	4.0412	4.2637	4.4872	4.7117	4.9372	5.1637	5.3912	5.6197	5.8492		
	REALISASI			0.7894	1.2083	1.6272	2.0461	2.4650	2.8839	3.3028	3.7217	4.1406	4.5595	4.9784	5.3973	5.8162	6.2351	6.6540	7.0729	7.4918	7.9107	8.3296	8.7485	9.1674	9.5863	10.0052	10.4241	10.8430	11.2619	11.6808		
	KUMULATIF REALISASI			0.7894	2.0167	3.6439	5.2711	6.8983	8.5255	10.1527	11.7799	13.4071	15.0343	16.6615	18.2887	19.9159	21.5431	23.1703	24.7975	26.4247	28.0519	29.6791	31.3063	32.9335	34.5607	36.1879	37.8151	39.4423	41.0695	42.6967		
	DEVIASI +/-			0.4619	1.1726	1.7933	2.4120	3.0309	3.6492	4.2677	4.8862	5.5047	6.1232	6.7417	7.3602	7.9787	8.5972	9.2157	9.8342	10.4527	11.0712	11.6897	12.3082	12.9267	13.5452	14.1637	14.7822	15.4007	16.0192	16.6377		

Mengingat
CONTOH
UNIVERSITAS HASANUDIN



LAPORAN MINGGU KE-5



**PROYEK PEMBUATAN FASADE GEDUNG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI JAKARTA
Jalan Petojo Utara VII no 8 - Jakarta**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Periode : 02 – 08 Februari 2026

dilaporkan :
KONSULTAN PENGAWAS



PT. MITRA PANCA KONSULTINDO
Construction Management & Quantity Surveyor

LAPORAN MINGGUAN

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Lokasi : Jl. Petojo Utara VII No.8, RT.15/RW.3, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
Periode : 02 Februari-08 Februari
Tanggal : 08 Februari 2026



I. Progress Pekerjaan .

No	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	Progress Pekerjaan (%)		
			Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu ini
1	SMKK	0,58%	22,94%	58,99%	81,93%
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17,81%	0,00%	0,00%	0,00%
3	PEKERJAAN FASAD	73,03%	3,18%	1,32%	4,50%
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Realisasi Progress Pekerjaan			2,46%	1,31%	3,76%
Rencana Progress Pekerjaan			1,36%	1,33%	2,41%
Deviasi Progress			1,10%	-0,02%	1,35%
Target Prestasi Minggu Depan			3,74%		

II. Waktu Pelaksanaan .

Waktu Pelaksanaan : hari
Waktu Berjalan : hari
Sisa Waktu : hari

III. Laporan Cuaca

Tanggal :	2	3	4	5	6	7	8		
Pagi									
Siang									
Sore									
Malam									

☐ : Cerah
☐ : Mendung
☐ : Gerimis
☐ : Hujan

IV. Permasalahan Pelaksanaan & Penyelesaian .

Permasalahan	Penyelesaian

V. Tenaga Kerja

Kontraktor			Sub Kontraktor / Vendor			Owner & MK		
No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah
1	Staff Kontraktor	1rang	1		Orang	1	Staff Owner	Orang
2	Pelaksana	Orang	2		Orang	2	Staff MK	1rang
3	Pelaksana K3	1rang	3		Orang	3		Orang
4	Tenaga helper	1rang	4		Orang	4		Orang
5	Tenaga Acp	19rang	5		Orang	5		Orang
6	Tenaga pilecap cremona	3rang						

Dilaporkan :

Nama : M.Adhitya Iswadi Putra

Jabatan : Staff MK

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 1

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 02 Februari-08 Februari






LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 2

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.



Periode : 02 Februari-08 Februari



LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 3

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 02 Februari-08 Februari

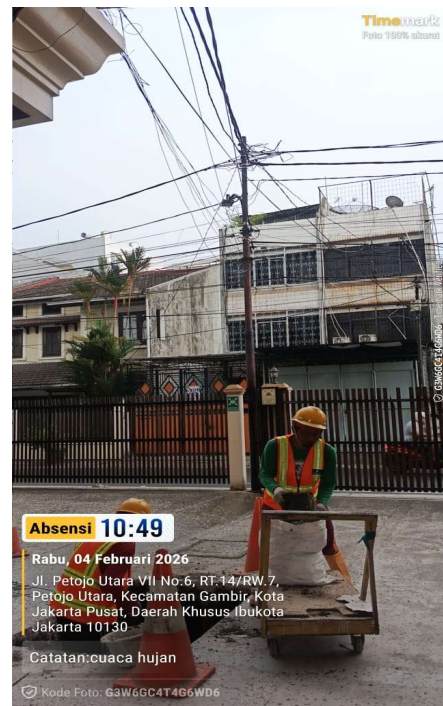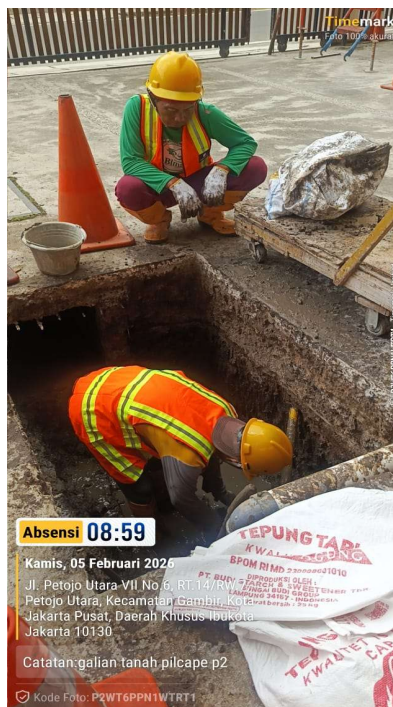

KONTRAKTOR :



CV. ALIF PUTERA PRATAMA
General Contractor
Jl. Delima No. 21 B, D Samarinda

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan
Universitas Hasanuddin di Jakarta.

Owner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DIREKTORAT LOGISTIK / UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG DAN JASA

KONTRAKTOR : CV. ALIF PUTERA PRATAMA
MANAJEMEN KONTRUKSI : PT. MITRA PANCA KONSULTINDO
NILAI KONTRAK : Rp. 4.058.000.000,00
WAKTU PELAKSANAAN : 100 Hari Kalender

Tanggal : 02 Februari s/d 08 Februari 2020
Minggu Ke : 5 (Lima)
Hari Ke : 32
Bisa Hari : 148

NO	PEKERJAAN	BOBOT (%)	S. D MINGGU LALU		MINGGU INI		S. D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	SIKK	0.98	22.00%	0.133	58.00%	0.342	81.00%	0.475	
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17.81	0.00%		0.00%		0.00%		
3	PEKERJAAN FASAD	73.03	3.10%	2.324	1.32%	0.065	4.50%	3.268	
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8.58	0.00%		0.00%		0.00%		
GRAND TOTAL		100.00		2.46		1.31		3.78	

Mengetahui
OWNER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
		(%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pekerjaan Persiapan dan Mobilisasi	0.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pembongkaran Dinding Pagar	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pembongkaran Pagar	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Persiapan									
PEKERJAAN POS JAGA									
1	Penggalan Pondasi Garis	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Urugan Kembali Bekas Galian	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pasir Urug	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Penghamparan Timbunan	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pasangan Batu Kosong (Anstampling)	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pondasi Batu Belah 1 SP : 4 PP	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pekerjaan Sloof 15x30								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Sloof	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Kolom Praktis								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Kolom	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 26 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Balok								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Balok	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
10	Pekerjaan Plat Beton								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Plat	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
11	Pekerjaan Atap								
-	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan 0,8 x 0,3 x 0,75 + Rangka Reng 0,7 x 0,4 x 0,45	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pekerjaan Atap Spandek Warna 0.4	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pekerjaan Flashing Atap	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
12	Pekerjaan Dinding								
-	Pemasangan Bata Ringan 10 cm	0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Acian Bangunan T.2mm	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
13	Pekerjaan Plafond								
-	Rangka Plafond Rangka Besi Hollow (20.40.2 + 40.40.2) 60 x 60 cm	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pemasangan Penutup Plafond Gypsum	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
14	Pekerjaan Lantai								
-	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Dinding Fin. Batu Alam	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
15	Pekerjaan Pintu Jendela								
-	Pintu Swing Uk. 90x205	0.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Jendela Geser Uk. 220x100	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
16	Pekerjaan Penggecatan								
-	Pengecatan Dinding Luar (Eksterior) Kamprot Putih	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pengecatan Dinding Dalam (Interior) Cat Putih	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pengecatan Plafond Warna Putih	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pos Jaga									

PEKERJAAN PAGAR	
1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Garis
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian
3	Pekerjaan Urugan Pasir
4	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong (Aanstamping)
5	Pekerjaan Pondasi Batu Kali 1 SP : 4 PP
6	Pekerjaan Sloof 20x35
-	Pembesian Dengan Besi Beton
-	Bekisting Sloof
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm
7	Pekerjaan Kolom 15x30
-	Pembesian Dengan Besi Beton
-	Bekisting Kolom
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm
8	Pekerjaan Balok
-	Pembesian Dengan Besi Beton
-	Bekisting Balok
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm
9	Pekerjaan Dinding
-	Pemasangan Bata Ringan 10 cm
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm
-	Acian Dinding Pagar T.2mm
10	Pengecatan Dinding Pagar (Eksterior) Kemplot Putih
Total Pekerjaan Pagar	
PEKERJAAN LANSEKAP	
1	Pekerjaan Bak Tanam
-	Pemasangan Bata Ringan 10 cm
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm
-	Acian Bak Taman T.2mm
-	Pengecatan Dinding Bak Taman (Eksterior) Kemplot Hitam
2	Penghamparan Tanah Timbunan
3	Penanaman Rumput Jepang
4	Penanaman Semak, Bunga kertas (Bougainvillea sp.)
5	Penanaman Pohon Sedang, Pandan bali (Cordyline australis)
6	Penanaman Pohon Sedang, Ketapang Kencana (Terminalia mantaly)
7	Pekerjaan Paving Block
-	Urugan Pasir di bawah Paving Block T.10 cm
-	Paving Block Tipe Ubln 21x21 T.8 cm
8	Pekerjaan Lantai Andesiit Bakar
-	Penghamparan Tanah Timbunan
-	Lantai Andesiit Bakar 10x10
9	Pekerjaan Kursi Beton
-	Pemasangan Bata Ringan 10 cm
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm
-	Acian Bak Taman T.2mm
-	Penghamparan Tanah Timbunan
-	Penanaman Rumput Jepang
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm
10	Pekerjaan Pengecatan Marka Area Parkir
11	Pekerjaan Besi Media Tanaman Rambat
-	Hollow Galvanis 4 x 4 Uk. 1,2 mm
-	Kawat Harmonika Galvanis
12	Pemasangan Marka Titik Kumpul
13	Pekerjaan Kanstin Beton uk. 60x21x35 cm
-	Pembesian Dengan Besi Beton
-	Bekisting Sloof
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm
Total Pekerjaan Lanskap	

BIBIT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI	
0.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
1.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
1.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

07.
