

		S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	
PEKERJAAN KANOPI					
1 Pekerjaan Kanopi Parkir					
- Hollow Galvanis 4 x 4 Uk. 1,2 mm	0.07	0.00%	-	0.00%	-
- Atap Solar Flat 3 mm	0.31	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Kanopi					
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL					
1 Pekerjaan Penarikan Instalasi Kabel Lampu					
- Lampu Downlight 10 watt	0.01	0.00%	-	0.00%	-
- Lampu Hias Tiang Taman	0.06	0.00%	-	0.00%	-
2 Pekerjaan Pemasangan Lampu					
- Lampu Downlight 10 watt	0.00	0.00%	-	0.00%	-
- Lampu Hias Tiang Taman	0.04	0.00%	-	0.00%	-
- Lampu Dinding Taman	0.03	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal					
GRAND TOTAL	17.81				

27

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN FASAD

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
				Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Shop drawings and As Built Drawing	Ls	0.05	10.00%	0.005	3.89%	0.002	13.89%	0.008	
2	Debris disposal	Ls	0.14	50.00%	0.068	0.00%	-	50.00%	0.068	
3	Transportation & Mobilisation	Ls	0.27	40.00%	0.109	10.00%	0.027	50.00%	0.137	
4	Peralatan dan perlengkapan kerja (Scaffolding dll)	Ls	2.87	35.00%	1.005	10.00%	0.287	45.00%	1.292	
Total Pekerjaan Pendahuluan										
PEKERJAAN PEMBONGKARAN										
1	Pembongkaran Dinding	m2	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pembongkaran Profil Luar	ls	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pembongkaran Topi Beton	m2	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pembongkaran										
PEKERJAAN FASAD										
1	Rangka Utama Kremona									
	- Hollow Galvanis 40x80x2 mm	m'	1.44	20.00%	0.288	10.00%	0.144	30.00%	0.432	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	3.15	20.00%	0.631	10.00%	0.315	30.00%	0.946	
	- Overstek Baja UNP 150x75x5,1 mm	m'	0.96	20.00%	0.192	10.00%	0.096	30.00%	0.288	
	- Dynabolt M12 x75 mm	bh	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Fasad ACP Solid Dark Grey									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Grey Grey	m2	12.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm China Grey	m2	6.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Fasad ACP Kisi kisi Red									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Red	m2	20.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 20x40x2 mm	m'	4.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Fasad ACP Bak Tanam									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm China Grey	m2	1.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Fasad ACP Pattern									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Yellow	m2	1.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	0.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Signage Logo & Text UNHAS Uk. 2920x1890 mm									
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Signage Logo & Text HADIN Uk. 3200x1710 mm									
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Finishing									
	- Pekerjaan Pengcatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	3.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pekerjaan Pengcatan Signage Logo UNHAS	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pekerjaan Pengcatan Signage Logo HADIN	m2	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Kanopi & Plafon WPC Bar									
	- Solar Tuff Dark Grey Transparan T. 8 mm	m2	0.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x80x1,4 mm	m'	0.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x1,4 mm	m'	0.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- WPC Bar Click On 50x90 mm	m'	5.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Tali Sling M20 (Ke Balok Gedung Eksisting)	m'	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pengcatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Fasad										
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA										
1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Poer	m3	0.02	10.00%	0.003	85.00%	0.018	100.00%	0.022	
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	m3	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	0.00	0.00%	-	100.00%	0.001	100.00%	0.001	
4	Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P1)									

27

- Bekisting Poer Pint	m2	0.01	0.00%	-	100.00%	0.013	100.00%	0.013	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.03	0.00%	-	85.00%	0.022	85.00%	0.022	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5 Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P2)									
- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	0.00%	-	100.00%	0.009	100.00%	0.009	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.02	0.00%	-	85.00%	0.017	85.00%	0.017	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6 Pekerjaan Kolom Pedestal (20x20)									
- Bekisting Kolom	m2	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.01	0.00%	-	85.00%	0.012	85.00%	0.012	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7 Pekerjaan Struktur Baja									
- WF 150 x 75 x 5 x 7	kg	1.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
- Base Plate t=12 mm	kg	0.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
- Baut M16 + 1 Nut + 2 Washer	Dh	0.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
- Angkur Bolt M16	Dh	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Struktur Baja									
GRAND TOTAL		73.03		2.11		0.96		3.29	

ey

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PEKERJAAN ELEKTRIKAL									
1	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu Sorot - Logo 4000k	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Solid 3000k	1.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Pattern GRC 3000k 40 Mtr @10 Mtr	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Downlight Outbow Spot 5 Watt Fasad Kisi-kisi 3000k 3 - 8 meter	0.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	3000kPengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 60 Cm	0.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 40 Cm 33000k	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pengadaan dan pemasangan traytek ladder	0.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pengadaan dan pemasangan siku penggantung 4x4 cm	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Elektrikal									
PENGAADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERIKUT KELENGKAPANNYA									
1	Pengadaan dan pemasangan Lampu Sorot	0.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip Selang - Fasad Solid + Besi Siku 2mm	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Stri Selang - Fasad Pattern @10 Mtr	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fasad Kisi-kisi	0.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 60 Cm	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 40 Cm	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Panel Penerangan Fasad	0.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan berikut kelengkapannya									
PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Header Pipa PVC AW dia 4"	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC AW dia 1"	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Gate Valve dia 50	0.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Roof Tank Kap 1500 Ltr	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pompa Tanster	0.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pompa Sirkulasi + Pengkabelan dan Perlipaan	0.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Filter + Carbon Filter	0.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Ground Tank 1m3	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bersih									
PEKERJAAN PIPA AIR BEKAS									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	0.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
PEKERJAAN PIPA AIR HUJAN									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"		0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pekerjaan perbalikan kemiringan profilan air hujan		0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
GRAND TOTAL		8.68							

27.

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN SMK

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
PENYIAPAN RKK									
	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	0.01	10.00%	0.001	3.80%	0.000	13.80%	0.001	
1	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja								
	Penyusunan Formulir								
	Total Pekerjaan Penyusunan RKK								
ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI									
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0.01	100.00%	0.011	0.00%	-	100.00%	0.011	
2	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	0.07	100.00%	0.008	0.00%	-	100.00%	0.008	
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0.02	100.00%	0.010	0.00%	-	100.00%	0.010	
	Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri								
ASURANSI									
1	Asuransi	0.34	0.00%	-	100.00%	0.342	100.00%	0.342	
	Total Asuransi								
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN									
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, dll)	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
2	Peralatan Pengasapan (Fogging)	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
	Total Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan								
RAMBU-RAMBU									
1	Rambu Petunjuk	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Rambu Larangan	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Rambu Peringatan	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Rambu Kewajiban	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Rambu Informasi	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	Total Rambu-Rambu								
LAIN-LAIN									
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	0.02	100.00%	0.015	0.00%	-	100.00%	0.015	
2	Bendera K3	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
	Total Lain-Lain								
	Sub Total	0.52		0.13		0.34		0.48	

KURVA S
JADWAL PERKULIAHAN
PEKERJAAN Pembangunan Gedung Program Studi di Lantai Kampus Utama (PISOR) UNHAS
LOKASI Jl. Petaja Utara V2 No.2, RT.15/RW.1, Petaja Utara, Kecamatan Gendit, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130
TAHUN ANGGARAN 2025
DURASI 180 HK

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOKOR (%)	DURASI (Bgg)	JANUARI												FEBRUARI												MARET												APRIL												MAY												JUNI												KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Minggu ke 1			Minggu ke 2			Minggu ke 3			Minggu ke 4			Minggu ke 5			Minggu ke 6			Minggu ke 7			Minggu ke 8			Minggu ke 9			Minggu ke 10			Minggu ke 11			Minggu ke 12			Minggu ke 13			Minggu ke 14			Minggu ke 15			Minggu ke 16			Minggu ke 17			Minggu ke 18			Minggu ke 19			Minggu ke 20			Minggu ke 21			Minggu ke 22			Minggu ke 23			Minggu ke 24				Minggu ke 25			Minggu ke 26			Minggu ke 27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				01-11	12-18	19-25	26-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01		02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15

Mengesah
DOKTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



LAPORAN MINGGU KE-6



**PROYEK PEMBUATAN FASADE GEDUNG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI JAKARTA
Jalan Petojo Utara VII no 8 - Jakarta**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Periode : 09 – 15 Februari 2026


dilaporkan :
KONSULTAN PENGAWAS



PT. MITRA PANCA KONSULTINDO
Construction Management & Quantity Surveyor

LAPORAN MINGGUAN

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Lokasi : Jl. Petojo Utara VII No.8, RT.15/RW.3, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
Periode : 09 Februari-15 Februari
Tanggal : 15 Februari 2026



I. Progress Pekerjaan .

No	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	Progress Pekerjaan (%)		
			s/d Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu ini
1	SMKK	0,58%	81,93%	5,97%	87,90%
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17,81%	0,00%	2,36%	2,36%
3	PEKERJAAN FASAD	73,03%	4,50%	0,81%	5,31%
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Realisasi Progress Pekerjaan			3,76%	1,05%	4,81%
Rencana Progress Pekerjaan			2,41%	1,33%	3,74%
Deviasi Progress			1,35%	-0,28%	1,07%
Target Prestasi Minggu Depan			5,26%		

II. Waktu Pelaksanaan .

Waktu Pelaksanaan : hari
 Waktu Berjalan : hari
 Sisa Waktu : hari

III. Laporan Cuaca

Tanggal :	9	10	11	12	13	14	15		
Pagi									
Siang									
Sore									
Malam									

☐ : Cerah
☐ : Mendung
☐ : Gerimis
☐ : Hujan

IV. Permasalahan Pelaksanaan & Penyelesaian .

Permasalahan	Penyelesaian
1. Material batu kali yang terlambat datang	1. Memastikan kedatangan material

V. Tenaga Kerja

Kontraktor			Sub Kontraktor / Vendor			Owner & MK		
No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah
1	Staff Kontraktor	1rang	1		Orang	1	Staff Owner	Orang
2	Pelaksana	Orang	2		Orang	2	Staff MK	1rang
3	Pelaksana K3	1rang	3		Orang	3		Orang
4	Tenaga helper	1rang	4		Orang	4		Orang
5	Tenaga Acp	19rang	5		Orang	5		Orang
6	Tenaga pilecap cremona	3rang						

Dilaporkan :


Nama : M.Adhitya Iswadi Putra

Jabatan : Staff MK

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 1




Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 09 Februari-15 Februari

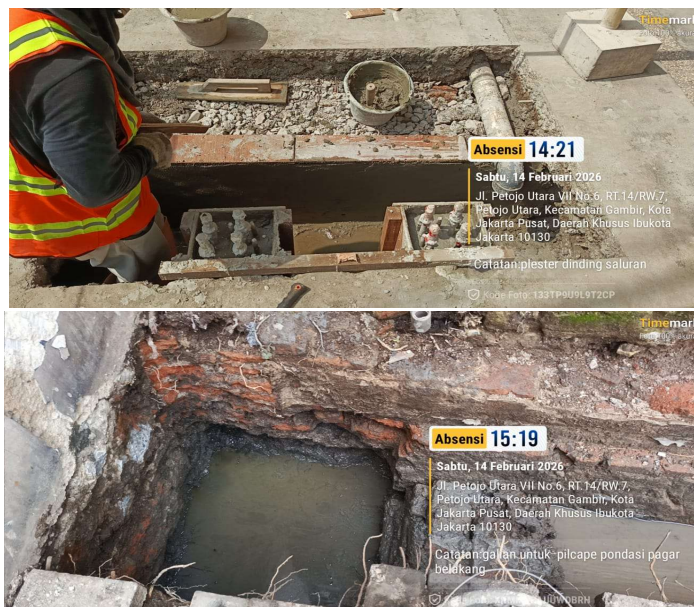

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 2



Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 09 Februari-15 Februari



LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 3

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 09 Februari-15 Februari

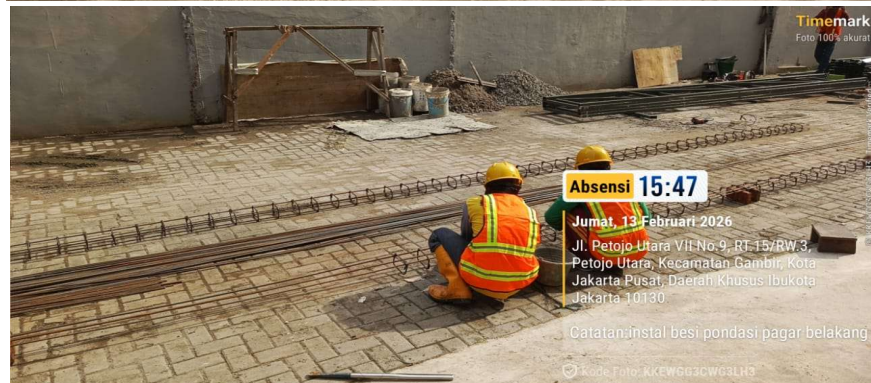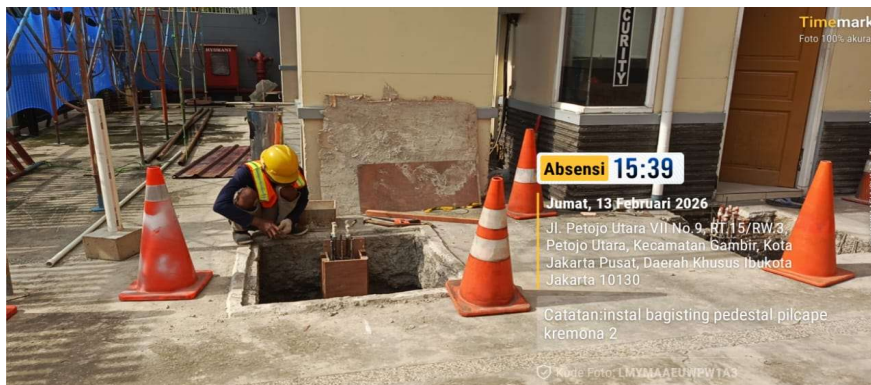


KONTRAKTOR :  CV. ALIF PUTERA PRATAMA General Contractor Jl. Belama No. 21A, III Samarinda	LAPORAN PROGRES MINGGUAN Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.	Owner KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN DIREKTORAT LOGISTIK / UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KONTRAKTOR : CV. ALIF PUTERA PRATAMA MANAJEMEN KONTRUKSI : PT. MITRA PANCA KONSULTINDO NILAI KONTRAK : Rp. 4.000.000.000,00 WAKTU PELAKSANAAN : 100 Hari Kalender	Tanggal : 09 Februari s/d 10 Februari 2020 Minggu Ke : 0 (Enam) Hari Ke : 30 Bisa Hari : 141	

NO	PEKERJAAN	BOBOT (%)	3.0 MINGGU LALU		MINGGU INI		3.0 MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	SIKOK	0.58	01.00%	0.475	5.94%	0.034	07.02%	0.510	
2	PEKERJAAN LANDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17.81	0.00%		2.30%	0.420	2.36%	0.420	
3	PEKERJAAN FASAD	73.03	4.50%	3.288	0.01%	0.588	0.31%	3.877	
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8.58	0.00%		0.00%		0.00%		
GRAND TOTAL		100.00		3.78		1.04		4.81	

Mengetahui :
OWNER
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Diperiksa & Disetujui Oleh
MANAJEMEN KONSTRUKSI
PT. MITRA PANCA KONSULTINDO



Jakarta, 16 Februari 2020
Dibuat Oleh
KONTRAKTOR
CV. ALIF PUTERA PRATAMA



LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE

: PERENCANAAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	S D MINGGU LALU		MINGGU III		S D MINGGU III		KETERANGAN	
							Progres	Rebet (%)	Progres	Rebet (%)	Progres	Rebet (%)		
PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pekerjaan Persiapan dan Mobilisasi	Ls	1.00	Rp	15.000.000.00	Rp	15.000.000.00	0.41	0.00%	-	00.67%	0.273	66.67%	0.273
2	Pembongkaran Dinding Pagar	m2	7.93	Rp	47.250.00	Rp	374.892.50	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3	Pembongkaran Pagar	m2	02.08	Rp	47.250.00	Rp	2.033.200.00	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Persiapan					Rp	18.367.972.50								
PEKERJAAN POS JAGA														
1	Pengastan Pondasi Gans	m3	24.75	Rp	158.450.25	Rp	3.922.109.10	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2	Urugan Kembali Bekas Galian	m2	12.38	Rp	88.031.25	Rp	1.089.474.75	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3	Pasir Urug	m3	0.56	Rp	264.991.61	Rp	148.378.50	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4	Penghamparan Timbunan	m3	2.35	Rp	200.025.00	Rp	470.468.80	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5	Pasangan Batu Kosong (Aksutampeng)	m3	1.68	Rp	680.446.61	Rp	1.143.150.20	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6	Pondasi Batu Brekah 1 SP - 4 PP	m3	5.24	Rp	1.142.730.00	Rp	5.983.334.28	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7	Pekerjaan Sloof 15x30													
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	142.29	Rp	10.889.38	Rp	2.374.709.80	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Bekisting Sloof	m2	6.72	Rp	174.841.68	Rp	1.174.037.40	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	0.50	Rp	1.263.905.52	Rp	637.008.38	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8	Pekerjaan Kolom Pklsn													
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	68.83	Rp	10.889.38	Rp	1.644.200.67	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Bekisting Kolom	m2	10.82	Rp	238.821.47	Rp	2.607.930.44	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	0.41	Rp	1.263.905.52	Rp	517.569.21	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9	Pekerjaan Balok													
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	64.94	Rp	10.889.38	Rp	1.083.840.48	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Bekisting Balok	m2	5.60	Rp	241.254.00	Rp	1.351.022.40	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	0.42	Rp	1.263.905.52	Rp	520.640.32	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10	Pekerjaan Plat Beton													
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	81.62	Rp	10.889.38	Rp	1.362.203.56	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Bekisting Plat	m2	3.31	Rp	268.071.47	Rp	887.316.56	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	0.46	Rp	1.263.905.52	Rp	582.023.27	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11	Pekerjaan Alap													
	Pekerjaan Rangka Alap Baja Ringan 0,8 x 0,3 x 0,75 + Rangka Reng 0,7 x 0,4 x 0,45	m2	7.12	Rp	604.800.00	Rp	4.021.378.45	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Pekerjaan Alap Spondrik Warna 0,4	m2	7.12	Rp	137.202.63	Rp	977.452.29	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Pekerjaan Flushing Alap	m	10.68	Rp	140.005.25	Rp	1.502.876.81	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12	Pekerjaan Dinding													
	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	m2	35.38	Rp	178.582.61	Rp	6.318.262.83	0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	78.69	Rp	75.810.91	Rp	5.960.032.37	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Actan Blangsan 1.2mm	m2	78.69	Rp	64.011.38	Rp	5.037.055.10	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13	Pekerjaan Platfond													
	Rangka Platfond Rangka Besi Hollow (20 40 2 + 40 40 2) 60 x 60 cm	m2	6.25	Rp	200.262.38	Rp	1.251.202.34	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Pemasangan Penutup Platfond Gypsum	m2	6.25	Rp	81.777.38	Rp	511.105.59	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14	Pekerjaan Lantai													
	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogeneous Tile Polish Ukuan 60 cm x 60 cm (15P : 2PP)	m2	6.38	Rp	391.892.00	Rp	2.500.271.34	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Dinding Fin. Batu Alam	m2	8.46	Rp	540.123.75	Rp	4.569.446.93	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15	Pekerjaan Pintu Jendela													
	Pintu Bating Uk. 90x205	Unit	1.00	Rp	3.600.000.00	Rp	3.600.000.00	0.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Jendela Geser Uk. 220x100	Unit	2.00	Rp	2.900.000.00	Rp	5.800.000.00	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16	Pekerjaan Pengecatan													
	Pengecatan Dinding Luar (Eksterior) Kampolet Putih	m2	47.12	Rp	118.127.81	Rp	5.568.182.53	0.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Pengecatan Dinding Dalam (Interior) Cat Putih	m2	31.87	Rp	60.875.44	Rp	1.921.837.56	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	Pengecatan Platfond Warna Putih	m2	6.25	Rp	60.606.50	Rp	411.859.28	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Pos Jaga					Rp	77.989.892.04								

KETERANGAN PAGAR				HARGA KATILAN		KIRI DAN KANAN		Berkas	S.D MINIGOU LALU		MINIGOU INI		S.D MINIGOU INI	
1	Pekerjaan Pengisian Pondasi Galian	m3	102.09	Rp	158,456.25	Rp	16,218,775.56	0.43	0.00%	-	9.77%	0.02%	5.77%	0.02%
2	Pekerjaan Urugan Keras Bekas Galian	m2	51.49	Rp	88,031.25	Rp	4,532,593.16	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	2.33	Rp	264,951.01	Rp	617,260.54	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4	Pekerjaan Pasangan Batu Kiri (Kantong)	m3	6.69	Rp	680,446.61	Rp	4,766,331.78	0.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5	Pekerjaan Pondasi Batu Kiri 1 SP : 4 PP	m3	21.79	Rp	1,142,730.00	Rp	24,804,044.43	0.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6	Pekerjaan Siof 20x35													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	602.05	Rp	16,689.38	Rp	6,660,663.08	0.27	0.00%	-	9.01%	0.02%	6.01%	0.02%
-	Bekisting Siof	m2	32.62	Rp	174,841.88	Rp	5,703,341.89	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membut 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	3.26	Rp	1,263,905.62	Rp	4,172,859.82	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7	Pekerjaan Kusen 15x30													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	523.83	Rp	16,689.38	Rp	8,742,449.17	0.24	0.00%	-	26.63%	0.05%	25.63%	0.05%
-	Bekisting Kusen	m2	67.33	Rp	238,821.47	Rp	13,691,634.80	0.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membut 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	2.87	Rp	1,263,905.62	Rp	3,622,985.18	0.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8	Pekerjaan Balok													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	379.57	Rp	16,689.38	Rp	6,334,723.10	0.17	0.00%	-	18.79%	0.03%	18.79%	0.03%
-	Bekisting Balok	m2	23.30	Rp	238,821.47	Rp	5,564,540.22	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membut 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	1.75	Rp	1,263,905.62	Rp	2,208,674.60	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9	Pekerjaan Dinding													
-	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	m2	181.03	Rp	178,562.61	Rp	32,327,017.43	0.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pestiran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	404.09	Rp	76,816.91	Rp	30,836,853.72	0.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Acian Dinding Pagar 1.2mm	m2	404.09	Rp	64,011.38	Rp	25,860,356.52	0.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10	Pengcatan Dinding Pagar (Eksterior) Kampoer Putih	m2	404.09	Rp	118,127.81	Rp	47,734,267.75	1.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
				Total Pekerjaan Pagar		Rp	247,567,883.72							
PEKERJAAN LANSEKAP														
1	Pekerjaan Bak Tarnan													
-	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	m2	62.80	Rp	178,562.61	Rp	11,214,988.07	0.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pestiran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	84.01	Rp	76,816.91	Rp	6,369,378.31	0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Acian Bak Tarnan 1.2mm	m2	84.01	Rp	64,011.38	Rp	5,377,565.61	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pengcatan Dinding Bak Tarnan (Eksterior) Kampoer Hitam	m2	84.01	Rp	118,127.81	Rp	9,923,917.53	0.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2	Penghamparan Tanah Timbunan	m3	21.82	Rp	200,026.00	Rp	4,385,148.08	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3	Pemasangan Rumput Jepang	m2	44.82	Rp	93,816.36	Rp	4,204,804.31	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4	Pemasangan Semak, Bunga kerdus (Bougenville ko)	m2	20.55	Rp	486,796.64	Rp	10,108,568.47	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5	Pemasangan Pohon Sedang, Pandan bad (Cordyline australis)	Bh	3.00	Rp	7,805,337.66	Rp	23,086,013.57	0.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6	Pemasangan Pohon Sedang, Kertepang Kencana (Terminalia mantaly)	Bh	2.00	Rp	4,321,587.86	Rp	8,643,175.71	0.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7	Pekerjaan Paving Block													
-	Urugan Pasir di bawah Paving Block 7.10 cm	m3	48.33	Rp	264,951.01	Rp	12,671,350.97	0.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Paving Block Tipe Usm 21x21 7.8 cm	m2	493.33	Rp	240,811.07	Rp	118,799,325.87	1.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8	Pekerjaan Lantai Andesi Bakur													
-	Penghamparan Tanah Timbunan	m3	22.35	Rp	200,026.00	Rp	4,451,056.31	0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Lantai Andesi Bakar 10x10	m2	89.01	Rp	426,889.31	Rp	37,906,827.23	1.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9	Pekerjaan Kurul Beton													
-	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	m2	10.84	Rp	178,562.61	Rp	1,935,835.52	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pestiran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	31.82	Rp	76,816.91	Rp	2,428,575.65	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Acian Bak Tarnan 1.2mm	m2	31.82	Rp	64,011.38	Rp	2,034,313.09	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Penghamparan Tanah Timbunan	m3	0.70	Rp	200,026.00	Rp	139,217.40	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pemasangan Rumput Jepang	m2	2.33	Rp	93,816.36	Rp	217,653.83	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membut 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	2.28	Rp	1,263,905.62	Rp	2,877,184.53	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10	Pekerjaan Pengisian Marka Area Parkir	m2	12.55	Rp	90,095.06	Rp	1,243,643.03	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11	Pekerjaan Benih Media Tanaman Pambuat	m2												
-	Hotlow Galvani 4 x 4 Uk. 1.2 mm	m	131.31	Rp	65,037.66	Rp	8,540,084.64	0.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Kawat Haisconika Galvanis	m2	68.62	Rp	26,000.00	Rp	1,841,360.00	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12	Pemasangan Marka Titik Kumout	Bh	3.00	Rp	840,000.00	Rp	2,520,000.00	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13	Pekerjaan Karsin Beton uk. 600x1005 cm													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	91.47	Rp	16,689.38	Rp	1,526,837.08	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Siof	m2	23.52	Rp	174,841.68	Rp	4,112,260.60	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membut 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	1.23	Rp	1,263,905.62	Rp	1,560,670.54	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
				Total Pekerjaan Lanskap		Rp	288,810,832.64							

PEKERJAAN KANOPI					UANG KATIHAN	UANG KATIHAN	BENTUK	K. D. MINOGU LALU		MINOGU INI		K. D. MINOGU INI	
1	Pekerjaan Kanopi Parkir												
-	Material Gypsum 4 x 4 Utl. 1.2 mm	m	41.00	Rp	65,037.00	Rp	2,705,560.50	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
-	Alas Solar Flat 3 mm	m	17.05	Rp	671,095.13	Rp	11,442,171.83	0.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					Total Pekerjaan Kanopi	Rp	14,147,738.38						
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL													
1	Pekerjaan Pemasangan Instalasi Kabel Lampu												
-	Lampu Downlight 10 watt	Tlk	1.00	Rp	299,081.25	Rp	299,081.25	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
-	Lampu Hias Tiang Taman	Tlk	7.00	Rp	299,081.25	Rp	2,093,568.75	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
2	Pekerjaan Pemasangan Lampu												
-	Lampu Downlight 10 watt	Bh	1.00	Rp	160,321.25	Rp	160,321.25	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
-	Lampu Hias Tiang Taman	Bh	7.00	Rp	195,000.00	Rp	1,365,000.00	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
-	Lampu Dinding Taman	Bh	8.00	Rp	125,000.00	Rp	1,000,000.00	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
					Total Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Rp	5,046,971.25						
GRAND TOTAL						Rp	651,354,786.83	17.81			0.42		0.42

ay

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN FASAD

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Shop drawings and As Built Drawing	ls	1.00	Rp 2,000,000.00	Rp 2,000,000.00
2	Debris disposal	ls	1.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00
3	Transportation & Mobilisation	ls	1.00	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00
4	Peralatan dan perlengkapan kerja (Stafolding dll)	ls	1.00	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00
Total Pekerjaan Pendahuluan				Rp	127,000,000.00
PEKERJAAN PEMONDOKAN					
1	Pembangunan Dinding	m ²	16.70	Rp 47,250.00	Rp 789,075.00
2	Pembangunan Pondasi Luar	ls	1.00	Rp 2,500,000.00	Rp 2,500,000.00
3	Pembangunan Topi Beton	m ²	3.28	Rp 60,750.00	Rp 199,260.00
Total Pekerjaan Pondokan				Rp	3,388,335.00
PEKERJAAN FASAD					
1	Rangka Utama Kerangka				
-	Holdow Galvanis 40x40x2 mm	m ²	568.00	Rp 87,808.01	Rp 50,022,345.04
-	Holdow Galvanis 40x40x2 mm	m ²	1,810.00	Rp 71,818.91	Rp 130,306,439.06
-	Direksi Baja UNP 150x75x5,1 mm	m ²	58.00	Rp 605,640.04	Rp 35,127,174.38
-	Dynabolt M12 475 mm	kg	720.00	Rp 4,218.75	Rp 3,037,500.00
2	Fasad ACP Solid Dark Grey				
-	ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm Grey Grey	m ²	380.34	Rp 780,092.50	Rp 297,005,007.85
-	ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm China Grey	m ²	298.73	Rp 780,092.50	Rp 233,005,130.83
-	Besi Siku 40x40x2 mm	m ²	608.00	Rp 70,336.41	Rp 42,764,533.00
3	Fasad ACP Kisi Kisi Red				
-	ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm Red	m ²	958.38	Rp 780,092.50	Rp 747,540,714.93
-	Holdow Galvanis 20x40x2 mm	m ²	2,878.00	Rp 58,185.41	Rp 167,402,477.19
4	Fasad ACP Blok Tirus				
-	ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm China Grey	m ²	88.32	Rp 780,092.50	Rp 68,894,236.60
-	Besi Siku 40x40x2 mm	m ²	620.00	Rp 70,336.41	Rp 43,608,571.88
5	Fasad ACP Pattern				
-	ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm Yellow	m ²	38.82	Rp 1,210,769.77	Rp 47,014,833.50
-	Holdow Galvanis 40x40x2 mm	m ²	212.00	Rp 71,818.91	Rp 15,225,608.75
6	Signage Logo & Text UNIAO UL 2020x1000 mm				
-	Cutting Stainless Steel 1220x2400x2 mm	m ²	7.03	Rp 2,262,824.71	Rp 15,809,911.08
-	Besi Siku 20x20x2 mm (membuat ke rangka fasad)	m ²	12.00	Rp 58,185.41	Rp 698,225.88
7	Signage Logo & Text UNIAO UL 3000x1710 mm				
-	Cutting Stainless Steel 1220x2400x2 mm	m ²	1.89	Rp 2,262,824.71	Rp 4,278,548.75
-	Besi Siku 20x20x2 mm (membuat ke rangka fasad)	m ²	12.00	Rp 58,185.41	Rp 698,225.88
8	Pekerjaan Finishing				
-	Pekerjaan Pengcatan Rangka Besi Hitam setara Awan	m ²	1,620.00	Rp 114,069.75	Rp 184,892,025.00
-	Pekerjaan Pengcatan Signage Logo UNIAO	m ²	2.63	Rp 643,371.43	Rp 1,692,066.32
-	Pekerjaan Pengcatan Signage Logo UNIAO	m ²	1.88	Rp 843,305.45	Rp 1,585,414.20
9	Pekerjaan Kanvas & Papan WPC Bar				
-	Solar Tuff Dark Grey Transparan T. 8 mm	m ²	20.74	Rp 1,101,647.20	Rp 22,846,090.92
-	Holdow Galvanis 40x40x2,4 mm	m ²	188.40	Rp 154,333.13	Rp 29,084,921.96
-	Holdow Galvanis 40x40x2,4 mm	m ²	178.41	Rp 74,835.18	Rp 13,349,568.13
-	WPC Bar Click On 60x60 mm	m ²	1,818.17	Rp 105,758.18	Rp 191,735,262.44
-	Teflon HD 120 (for Bekas Dinding Dinding)	m ²	20.20	Rp 100,151.03	Rp 2,023,052.16
-	Pengcatan Rangka Besi Hitam setara Awan	m ²	11.50	Rp 110,088.73	Rp 1,266,020.83
Total Pekerjaan Fasad				Rp	3,434,048,741.81
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA					
1	Pekerjaan Pengelasan Pondasi Pagar	m ²	9.00	Rp 158,458.25	Rp 1,426,124.25
2	Pekerjaan Ujung Kanvas Bekas Galian	m ²	2.50	Rp 88,031.25	Rp 220,078.13
3	Pekerjaan Ujung Pagar	m ²	0.18	Rp 284,021.01	Rp 51,123.78
4	Pekerjaan Pondasi Pagar Pagar (PFI)				

DOBOT	S D MINGGU LALU		MINGGU INI		S D MINGGU INI		KETERANGAN
	Progres	Bebat	Progres	Bebat	Progres	Bebat	
(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
0.05	13.89%	0.008	3.89%	0.032	17.78%	0.010	
0.14	50.00%	0.008	10.00%	0.021	60.00%	0.009	
0.27	50.00%	0.137	0.00%	-	50.00%	0.137	
2.87	45.00%	1.292	0.00%	-	45.00%	1.292	
0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
1.44	30.00%	0.432	10.00%	0.144	40.00%	0.576	
3.13	30.00%	0.940	10.00%	0.310	40.00%	1.261	
0.96	30.00%	0.268	0.00%	-	30.00%	0.268	
0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
12.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
1.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
20.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
1.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
1.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
1.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
0.03	0.00%	-	47.86%	0.003	47.86%	0.003	
0.00	100.00%	0.001	0.00%	-	100.00%	0.001	

ey.

• Bekisting Pagar Plat	m ²	2.60	Rp	174,841.68	Rp	458,367.25
• Perencanaan Dengan Besi Beton	kg	58.67	Rp	18,693.38	Rp	945,883.63
• Mem buat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m ³	1.07	Rp	1,283,925.13	Rp	1,353,642.82
6 Pekerjaan Pondasi Pagar Plat (P2)						
• Bekisting Pagar Plat	m ²	1.60	Rp	174,841.68	Rp	279,746.52
• Perencanaan Dengan Besi Beton	kg	43.25	Rp	18,693.38	Rp	721,784.03
• Mem buat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m ³	0.47	Rp	1,283,925.12	Rp	595,295.55
7 Pekerjaan Kolom Pedestal (20x20)						
• Bekisting Kolom	m ²	2.24	Rp	228,821.47	Rp	514,950.09
• Perencanaan Dengan Besi Beton	kg	31.72	Rp	18,693.38	Rp	593,430.77
• Mem buat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m ³	0.11	Rp	1,283,925.12	Rp	141,567.42
8 Pekerjaan Struktur Balok						
• WT 310 x 75 x 5 x 7	kg	1,370.48	Rp	50,887.53	Rp	69,878,372.08
• Baki Plat (x12mm)	kg	168.47	Rp	45,804.89	Rp	7,682,889.69
• Balok H18 x 1 Foot x 3 Washer	Sh	524.00	Rp	11,200.00	Rp	21,552,300.00
• Angkur Bodi H18	Sh	18.00	Rp	1,120.00	Rp	20,160.00
Total Pekerjaan Struktur Balok					Rp	118,223,521.86
GRAND TOTAL					Rp	2,878,485,095.31

0.01	100.00%	0.013	0.00%	-	100.00%	0.013
0.03	85.00%	0.022	15.00%	0.004	100.00%	0.026
0.04	0.00%	-	100.00%	0.037	100.00%	0.037
0.05	100.00%	0.039	0.00%	-	100.00%	0.039
0.07	85.00%	0.017	15.00%	0.003	100.00%	0.020
0.08	0.00%	-	100.00%	0.016	100.00%	0.016
0.09	0.00%	-	100.00%	0.015	100.00%	0.015
0.10	85.00%	0.012	15.00%	0.002	100.00%	0.014
0.11	0.00%	-	100.00%	0.004	100.00%	0.004
1.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.02	0.00%	-	100.00%	0.023	100.00%	0.023
11.01	-	1.23	-	0.53	-	1.65

by

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
		(%)		(%)		(%)		(%)	
PEKERJAAN ELEKTRIKAL									
1	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu Sorot - Logo 4000k	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Solid 3000k	1.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Pattern GRC 3000k 40 Mtr @10 Mtr	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Downlight Outbow Spot 5 Watt Fasad Kisi-kisi 3000k 3 - 8 meter	0.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	3000kPengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 60 Cm	0.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 40 Cm 33000k	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pengadaan dan pemasangan trayek ladder	0.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pengadaan dan pemasangan siku penggantung 4x4 cm	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Elektrikal									
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERIKUT KELENGKAPANNYA									
1	Pegadaan dan pemasangan Lampu Sorot	0.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip Selang - Fasad Solid + Besi Siku 2mm	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Stri Selang - Fasad Pattern @10 Mtr	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fasad Kisi-kisi	0.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 60 Cm	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 40 Cm	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Panel Penerangan Fasad	0.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan berikut kelengkapannya									
PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Header Pipa PVC Aw dia 4"	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC AW dia 1"	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Gate Valve dia 50	0.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Roof Tank Kap 1500 Ltr	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pompa Transfer	0.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pompa Sirkulasi + Pengkabelan dan Perpipaan	0.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Filter + Carbon Filter	0.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Ground Tank 1m3	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bersih									
PEKERJAAN PIPA AIR BEKAS									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	0.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
PEKERJAAN PIPA AIR HUJAN									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pekerjaan perbaikan kemiringan profilan air hujan	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Hujan									
GRAND TOTAL		8.60		-		-			


LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN SMK

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PENYIAPAN RKK									
	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	0.01	13.80%	0.001	3.80%	0.000	17.78%	0.001	
1	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja								
	Penyiapan Formulir								
Total Pekerjaan Penyiapan RKK									
ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI									
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0.01	100.00%	0.011	0.00%	-	100.00%	0.011	
2	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	0.07	100.00%	0.068	0.00%	-	100.00%	0.068	
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri									
ASURANSI									
1	Asuransi	0.34	100.00%	0.342	0.00%	-	100.00%	0.342	
Total Asuransi									
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN									
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, dll)	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
2	Peralatan Pengasapan (Fogging)	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan									
RAMBU-RAMBU									
1	Rambu Petunjuk	0.01	0.00%	-	100.00%	0.007	100.00%	0.007	
-	Rambu Larangan	0.01	0.00%	-	100.00%	0.007	100.00%	0.007	
-	Rambu Peringatan	0.01	0.00%	-	100.00%	0.007	100.00%	0.007	
-	Rambu Kewajiban	0.01	0.00%	-	100.00%	0.007	100.00%	0.007	
-	Rambu Informasi	0.01	0.00%	-	100.00%	0.007	100.00%	0.007	
Total Rambu-Rambu									
LAIN-LAIN									
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
2	Bendera K3	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Lain-Lain									
Sub Total		0.52		0.48		0.03		0.51	

[illegible]

Mengshi
 OTHER
 UNIVERSITAS HAZARD



LAPORAN MINGGU KE-7



**PROYEK PEMBUATAN FASADE GEDUNG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI JAKARTA**
Jalan Petojo Utara VII no 8 - Jakarta

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Periode : 16 – 22 Februari 2026

dilaporkan :
KONSULTAN PENGAWAS



PT. MITRA PANCA KONSULTINDO
Construction Management & Quantity Surveyor

LAPORAN MINGGUAN

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Lokasi : Jl. Petojo Utara VII No.8, RT.15/RW.3, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
Periode : 16 Februari-22 Februari
Tanggal : 15 Februari 2026



I. Progress Pekerjaan .

No	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	Progress Pekerjaan (%)		
			s/d Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu ini
1	SMKK	0,58%	87,87%	0,05%	87,92%
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17,81%	2,36%	2,36%	4,72%
3	PEKERJAAN FASAD	73,03%	5,31%	3,38%	8,69%
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8,58%	0,00%	4,93%	4,93%
Realisasi Progress Pekerjaan			4,81%	3,31%	8,12%
Rencana Progress Pekerjaan			3,74%	1,52%	5,26%
Deviasi Progress			1,07%	1,79%	2,86%
Target Prestasi Minggu Depan			7,12%		

II. Waktu Pelaksanaan .

Waktu Pelaksanaan : hari
 Waktu Berjalan : hari
 Sisa Waktu : hari

III. Laporan Cuaca

Tanggal :	16	17	18	19	20	21	22		
Pagi									
Siang									
Sore									
Malam									

☐ : Cerah
☐ : Mendung
☐ : Gerimis
☐ : Hujan

IV. Permasalahan Pelaksanaan & Penyelesaian .

Permasalahan	Penyelesaian
1. beberapa gambar forkon tidak sesuai dengan eksisting	1.kontraktor menyesuaikan keadaan eksisting dengan mengajukan shop drawing yang menyesuaikan konsisi eksisting

V. Tenaga Kerja

Kontraktor			Sub Kontraktor / Vendor			Owner & MK		
No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah
1	Staff Kontraktor	1rang	1		Orang	1	Staff Owner	Orang
2	Pelaksana	1rang	2		Orang	2	Staff MK	1rang
3	Pelaksana K3	1rang	3		Orang	3		Orang
4	Tenaga helper	9rang	4		Orang	4		Orang
5	Tenaga Acp	3rang	5		Orang	5		Orang
6	Tenaga pilecap cremona	8rang						

Dilaporkan :




Nama : M.Adhitya Iswadi Putra

Jabatan : Staff MK

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 1

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 16 Februari-22 Februari

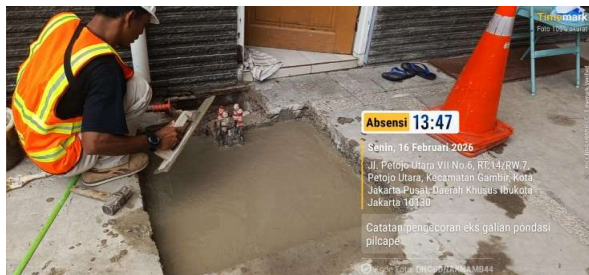

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 2

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 16 Februari-22 Februari

