

LAPORAN MINGGU KE-14



**PROYEK PEMBUATAN FASADE GEDUNG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI JAKARTA
Jalan Petojo Utara VII no 8 - Jakarta**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Periode : 06 April – 12 April 2026

dilaporkan :
KONSULTAN PENGAWAS




PT. MITRA PANCA KONSULTINDO
Construction Management & Quantity Surveyor

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 1

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 06 April -12 April

1 PEK. FABRIKASI KREMONA

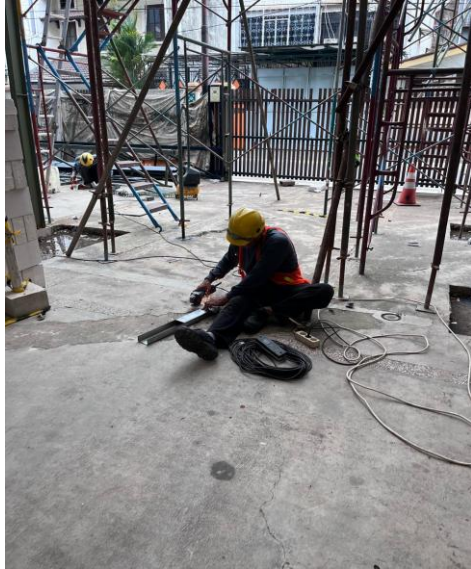

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 2

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 06 April -12 April

1 PEK. FABRIKASI KREMONA




LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 3

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 06 April -12 April

1 PEK.SITOUT AREA

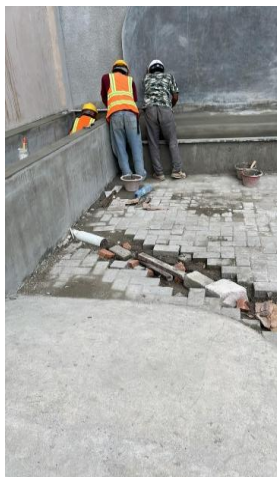

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 3

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 06 April -12 April

1 PEK.FABRIKASI DAN PEMASANGAN OVERSTEK KREMONA



KONTRAKTOR :  CV. ALIF PUTERA PRATAMA General Contractor Jl. Delima No. 21 B. B. Samarinda	LAPORAN PROGRES MINGGUAN Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.	Owner KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN DIREKTORAT LOGISTIK / UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KONTRAKTOR : CV. ALIF PUTERA PRATAMA MANAJEMEN KONTROL : PT. MITRA PANCA KONSULTINDO NILAI KONTRAK : Rp. 4.098.900.000,00 WAKTU PELAKSANAAN : 180 Hari Kalender	Tanggal : 6 April s.d 12 April 2026 Minggu Ke : 14 (Empat Belas) Hari Ke : 85 Sisa Hari : 95	

NO	PEKERJAAN	HARGA	TOTAL	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
					Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
					(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	SMKX	Rp 21,206,260.00	Rp 21,206,260.00	0.88	88.19%	0.511	0.09%	0.000	88.24%	0.512	
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	Rp 651,364,780.83	Rp 651,364,780.83	17.81	11.13%	1.883	3.33%	0.583	14.49%	2.576	
3	PEKERJAAN FASAD	Rp 2,670,486,099.31	Rp 2,670,486,099.31	73.03	16.69%	12.192	4.83%	3.524	21.52%	15.716	
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	Rp 313,626,232.91	Rp 313,626,232.91	8.58	17.07%	1.464	0.00%	-	17.07%	1.464	
	GRAND TOTAL	Rp 3,656,672,363.06		100.00		16.15		4.12		20.27	

Mengantahul :
OWNER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE

: PERENCANAAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
					(Rp)			(%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	
PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pekerjaan Penilaian dan Mobilisasi	LS	1.00	Rp	15,000,000.00	Rp	15,000,000.00	0.41	66.67%	0.273	3.33%	0.014	70.00%	0.287
2	Pembongkaran Dinding Pagar	m2	7.83	Rp	47,250.00	Rp	374,882.50	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3	Pembongkaran Pagar	m2	82.08	Rp	47,250.00	Rp	2,933,280.00	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Persiapan						Rp	18,307,872.50							
PEKERJAAN POS JAGA														
1	Penggiliran Pondasi Garis	m3	24.75	Rp	158,456.25	Rp	3,922,106.10	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2	Urugan Kembali Bekas Galian	m2	12.38	Rp	88,031.25	Rp	1,089,474.75	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3	Psar Uhag	m3	0.56	Rp	264,961.61	Rp	148,378.50	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4	Penghamparan Tambunan	m3	2.38	Rp	200,025.00	Rp	470,458.80	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5	Pasangan Batu Kosong (Amstamping)	m3	1.88	Rp	680,446.81	Rp	1,143,150.30	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6	Pondasi Batu Belah 1 SP : 4 PP	m3	5.34	Rp	1,142,730.00	Rp	5,983,334.28	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7	Pekerjaan Sloof 15x30													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	142.29	Rp	16,889.38	Rp	2,374,799.80	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Sloof	m2	6.72	Rp	174,841.88	Rp	1,174,837.40	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.50	Rp	1,263,906.52	Rp	637,006.38	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8	Pekerjaan Kolom Praktis													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	98.53	Rp	16,889.38	Rp	1,644,390.67	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Kolom	m2	10.92	Rp	238,821.47	Rp	2,607,930.44	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.41	Rp	1,263,906.52	Rp	517,569.31	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9	Pekerjaan Balok													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	64.94	Rp	16,889.38	Rp	1,083,640.48	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Balok	m2	6.80	Rp	241,254.00	Rp	1,361,022.40	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.42	Rp	1,263,906.52	Rp	530,640.32	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10	Pekerjaan Plat Beton													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	81.82	Rp	16,889.38	Rp	1,362,263.56	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Plat	m2	3.31	Rp	268,071.47	Rp	887,318.58	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.40	Rp	1,263,906.52	Rp	502,023.27	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11	Pekerjaan Atap													
-	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan 0.8 x 0.3 x 0.75 + Rangka Reng 0.7 x 0.4 x 0.45	m2	7.12	Rp	564,800.06	Rp	4,021,376.45	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pekerjaan Atap Spandek Warna 0.4	m2	7.12	Rp	137,282.83	Rp	977,462.29	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pekerjaan Flashing Atap	m	10.89	Rp	149,006.25	Rp	1,592,878.81	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12	Pekerjaan Dinding													
-	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	m2	35.38	Rp	178,582.61	Rp	6,318,252.83	0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	78.89	Rp	75,818.91	Rp	5,966,032.37	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Acian Bangunan 7.2mm	m2	78.89	Rp	64,011.38	Rp	5,037,056.10	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13	Pekerjaan Plafond													
-	Rangka Plafond Rangka Besi Hollow (20.40.2 + 40.40.2) 80 x 60 cm	m2	6.25	Rp	200,362.38	Rp	1,252,202.34	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pemasangan Penutup Plafond Gypsum	m2	6.25	Rp	81,777.38	Rp	511,108.59	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14	Pekerjaan Lantai													
-	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m2	6.38	Rp	391,882.08	Rp	2,500,271.34	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Dinding Fin. Batu Alam	m2	8.48	Rp	540,123.75	Rp	4,589,446.93	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15	Pekerjaan Pintu Jendela													
-	Pintu Swing Uk. 90x205	Unit	1.00	Rp	3,500,000.00	Rp	3,500,000.00	0.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Jendela Geser Uk. 220x100	Unit	2.00	Rp	2,900,000.00	Rp	5,800,000.00	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16	Pekerjaan Pengcatan													
-	Pengecatan Dinding Luar (Eksterior) Kamprot Putih	m2	47.12	Rp	118,127.81	Rp	5,566,182.53	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pengecatan Dinding Dalam (Interior) Cat Putih	m2	31.57	Rp	80,875.44	Rp	1,821,837.66	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pengecatan Plafond Warna Putih	m2	6.25	Rp	66,505.50	Rp	415,809.38	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Pos Jaga						Rp	77,380,602.94							

PEKERJAAN PAGAR				MARNI RATIHAN		RIHNI AN MARNI		RUMAH	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI	
1	Pekerjaan Punggolan Pondasi Galian	m3	102.89	Rp	168,456.25	Rp	16,318,776.36	0.45	5.77%	0.026	0.00%	-	5.77%	0.026
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	m2	51.48	Rp	88,031.25	Rp	4,532,863.16	0.12	5.77%	0.007	0.00%	-	5.77%	0.007
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	2.33	Rp	264,981.61	Rp	617,360.54	0.02	23.18%	0.004	0.00%	-	23.18%	0.004
4	Pekerjaan Pasangan Batu Kokoing (Aanstampang)	m3	6.99	Rp	680,446.61	Rp	4,756,321.78	0.13	15.45%	0.020	0.00%	-	15.45%	0.020
5	Pekerjaan Pondasi Batu Kali 1 SP : 4 PP	m3	21.79	Rp	1,142,730.00	Rp	24,894,944.42	0.68	18.59%	0.127	0.00%	-	18.59%	0.127
6	Pekerjaan Sloof 20x35													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	592.05	Rp	16,889.38	Rp	9,880,863.88	0.27	9.01%	0.024	0.00%	-	9.01%	0.024
-	Bekisting Sloof	m2	32.82	Rp	174,841.88	Rp	5,703,341.96	0.16	19.31%	0.030	0.00%	-	19.31%	0.030
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	3.28	Rp	1,263,905.52	Rp	4,122,868.82	0.11	19.31%	0.022	0.00%	-	19.31%	0.022
7	Pekerjaan Kolom 15x30													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	523.83	Rp	16,889.38	Rp	8,742,448.17	0.24	26.83%	0.064	0.00%	-	26.83%	0.064
-	Bekisting Kolom	m2	57.33	Rp	238,821.47	Rp	13,691,634.80	0.37	25.12%	0.094	0.00%	-	25.12%	0.094
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	2.87	Rp	1,263,905.52	Rp	3,622,985.18	0.10	37.68%	0.037	0.00%	-	37.68%	0.037
8	Pekerjaan Balok													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	379.57	Rp	16,889.38	Rp	6,334,723.10	0.17	18.79%	0.033	0.00%	-	18.79%	0.033
-	Bekisting Balok	m2	23.30	Rp	238,821.47	Rp	5,664,540.22	0.15	30.80%	0.047	0.00%	-	30.80%	0.047
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	1.75	Rp	1,263,905.52	Rp	2,206,678.90	0.06	20.60%	0.012	0.00%	-	20.60%	0.012
9	Pekerjaan Dinding													
-	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	m2	181.03	Rp	178,582.61	Rp	32,327,917.43	0.88	25.96%	0.230	6.96%	0.062	32.95%	0.291
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	404.09	Rp	75,816.91	Rp	30,636,853.72	0.84	12.47%	0.104	2.29%	0.019	14.76%	0.124
-	Acian Dinding Pagar 1.2mm	m2	404.09	Rp	64,011.38	Rp	25,896,568.52	0.71	0.00%	-	14.76%	0.104	14.76%	0.104
10	Pengicatan Dinding Pagar (Eksterior) Kamprom Putih	m2	404.09	Rp	118,127.81	Rp	47,734,267.76	1.31	0.00%	-	14.76%	0.193	14.76%	0.193
Total Pekerjaan Pagar							Rp	247,887,863.72						
PEKERJAAN LANSEKAP														
1	Pekerjaan Bak Tamam													
-	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	m2	62.80	Rp	178,582.61	Rp	11,214,988.57	0.31	36.39%	0.112	12.75%	0.039	49.14%	0.151
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	84.01	Rp	75,816.91	Rp	6,389,378.31	0.17	94.40%	0.086	18.07%	0.033	73.46%	0.128
-	Acian Bak Tamam 1.2mm	m2	84.01	Rp	64,011.38	Rp	5,377,595.81	0.15	40.80%	0.060	32.67%	0.048	73.46%	0.108
-	Pengicatan Dinding Bak Tamam (Eksterior) Kamprom Hitam	m2	84.01	Rp	118,127.81	Rp	9,923,917.53	0.27	0.00%	-	30.00%	0.081	30.00%	0.081
2	Penghamparan Tanah Timbunan	m3	21.82	Rp	200,025.00	Rp	4,386,148.06	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3	Penanaman Rumput Jepang	m2	44.82	Rp	93,815.36	Rp	4,204,804.31	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4	Penanaman Semak, Bunga kertas (Bougainvillea sp.)	m2	20.96	Rp	486,796.54	Rp	10,198,396.47	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5	Penanaman Pohon Sedang, Pandan beli (Cordyline australis)	Bt	3.00	Rp	7,865,337.86	Rp	23,696,013.57	0.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6	Penanaman Pohon Sedang, Ketapang Kencana (Terminalia mantaly)	Bt	2.00	Rp	4,321,587.86	Rp	8,643,175.71	0.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7	Pekerjaan Paving Block													
-	Urugan Pasir di bawah Paving Block T.10 cm	m3	49.33	Rp	264,981.61	Rp	13,071,350.87	0.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Paving Block Tipe Ubin 25x25 T.8 cm	m2	493.33	Rp	240,811.07	Rp	118,799,325.87	3.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8	Pekerjaan Lantai Andesit Bakar													
-	Penghamparan Tanah Timbunan	m3	22.25	Rp	200,025.00	Rp	4,451,066.31	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Lantai Andesit Bakar 10x10	m2	88.01	Rp	435,889.31	Rp	37,906,677.22	1.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9	Pekerjaan Karai Beton													
-	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	m2	10.84	Rp	178,582.61	Rp	1,935,835.52	0.05	100.00%	0.053	0.00%	-	100.00%	0.053
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	31.92	Rp	75,816.91	Rp	2,420,075.86	0.07	100.00%	0.066	0.00%	-	100.00%	0.066
-	Acian Bak Tamam 1.2mm	m2	31.92	Rp	64,011.38	Rp	2,043,243.00	0.06	100.00%	0.056	0.00%	-	100.00%	0.056
-	Penghamparan Tanah Timbunan	m3	0.79	Rp	200,025.00	Rp	136,217.40	0.00	100.00%	0.004	0.00%	-	100.00%	0.004
-	Penanaman Rumput Jepang	m2	2.32	Rp	93,815.36	Rp	217,861.63	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	2.28	Rp	1,263,905.52	Rp	2,877,154.53	0.08	100.00%	0.079	0.00%	-	100.00%	0.079
10	Pekerjaan Pengicatan Marka Area Parkir	m2	12.65	Rp	99,095.06	Rp	1,243,643.03	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11	Pekerjaan Besi Medis Tanaman Rambat	m2												
-	Hollow Galvanes 4 x 4 Uk. 1.2 mm	m	131.31	Rp	65,037.86	Rp	8,540,994.64	0.23	100.00%	0.234	0.00%	-	100.00%	0.234
-	Kawat Harmonika Galvanes	m2	58.82	Rp	28,000.00	Rp	1,641,360.00	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12	Pemasangan Marka Titik Kampul	Bt	3.00	Rp	840,000.00	Rp	2,520,000.00	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13	Pekerjaan Kanstin Beton uk. 60x21x36 cm													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	91.47	Rp	16,889.38	Rp	1,526,667.08	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Sloof	m2	23.52	Rp	174,841.88	Rp	4,112,380.90	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	1.23	Rp	1,263,905.52	Rp	1,560,670.54	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Lansekap							Rp	288,919,832.94						

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN FASAD

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
				Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Shop drawings and As Built Drawing	Ls	0.05	41.11%	0.022	3.89%	0.002	45.00%	0.025	
2	Debris disposal	Ls	0.14	80.00%	0.109	20.00%	0.027	100.00%	0.137	
3	Transportation & Mobilisation	Ls	0.27	75.00%	0.205	5.00%	0.014	80.00%	0.219	
4	Peralatan dan perlengkapan kerja (Scaffolding dll)	Ls	2.87	87.50%	2.513	10.00%	0.287	97.50%	2.800	
Total Pekerjaan Pendahuluan										
PEKERJAAN PEMBONGKARAN										
1	Pembongkaran Dinding	m2	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pembongkaran Profil Luar	ls	0.07	100.00%	0.068	0.00%	-	100.00%	0.068	
3	Pembongkaran Topi Beton	m2	0.01	100.00%	0.006	0.00%	-	100.00%	0.006	
Total Pekerjaan Pembongkaran										
PEKERJAAN FASAD										
1	Rangka Utama Kremona									
-	Hollow Galvanis 40x80x2 mm	m'	1.44	75.25%	1.083	10.00%	0.144	85.25%	1.227	
-	Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	3.15	75.25%	2.373	10.00%	0.315	85.25%	2.688	
-	Overstek Baja UNP 150x75x5,1 mm	m'	0.96	75.25%	0.723	10.00%	0.096	85.25%	0.819	
-	Dynabolt M12 x75 mm	bh	0.08	75.25%	0.063	10.00%	0.008	85.25%	0.071	
2	Fasad ACP Solid Dark Grey									
-	ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Grey Grey	m2	12.38	0.00%	-	10.00%	1.238	10.00%	1.238	
-	ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm China Grey	m2	6.39	0.00%	-	10.00%	0.639	10.00%	0.639	
-	Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.17	0.00%	-	10.00%	0.117	10.00%	0.117	
3	Fasad ACP Kisi-kisi Red									
-	ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Red	m2	20.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Hollow Galvanis 20x40x2 mm	m'	4.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Fasad ACP Bak Tanam									
-	ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm China Grey	m2	1.88	0.00%	-	10.00%	0.188	10.00%	0.188	
-	Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.19	0.00%	-	10.00%	0.119	10.00%	0.119	
5	Fasad ACP Pattern									
-	ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Yellow	m2	1.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	0.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Signage Logo & Text UNHAS Uk. 2920x1890 mm									
-	Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Signage Logo & Text HADIN Uk. 3200x1710 mm		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Finishing									
-	Pekerjaan Pengecatan Rangka Besi Hitam setara Avlan	m2	3.29	80.00%	1.971	10.00%	0.329	70.00%	2.300	
-	Pekerjaan Pengecatan Signage Logo UNHAS	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pekerjaan Pengecatan Signage Logo HADIN	m2	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Kanopi & Plafon WPC Bar									
-	Solar Tuff Dark Grey Transparan T. 8 mm	m2	0.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Hollow Galvanis 40x80x1,4 mm	m'	0.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Hollow Galvanis 40x40x1,4 mm	m'	0.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	WPC Bar Click On 50x90 mm	m'	5.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Tali Sling M20 (Ke Balok Gedung Eksisting)	m'	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pengecatan Rangka Besi Hitam setara Avlan	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Fasad										
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA										
1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Poer	m3	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	m3	0.01	100.00%	0.006	0.00%	-	100.00%	0.006	
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	0.00	100.00%	0.001	0.00%	-	100.00%	0.001	
4	Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P1)									

- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	100.00%	0.013	0.00%	-	100.00%	0.013	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.03	100.00%	0.026	0.00%	-	100.00%	0.026	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.04	100.00%	0.037	0.00%	-	100.00%	0.037	
5 Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P2)									
- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	100.00%	0.009	0.00%	-	100.00%	0.009	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.02	100.00%	0.020	0.00%	-	100.00%	0.020	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
6 Pekerjaan Kolom Pedestal (20x20)									
- Bekisting Kolom	m2	0.01	100.00%	0.015	0.00%	-	100.00%	0.015	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.01	100.00%	0.014	0.00%	-	100.00%	0.014	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.00	100.00%	0.004	0.00%	-	100.00%	0.004	
7 Pekerjaan Struktur Baja									
- WF 150 x 75 x 5 x 7	kg	1.91	100.00%	1.911	0.00%	-	100.00%	1.911	
- Base Plate t=12 mm	kg	0.21	100.00%	0.210	0.00%	-	100.00%	0.210	
- Baut M16 + 1 Nut + 2 Washer	Bh	0.71	100.00%	0.707	0.00%	-	100.00%	0.707	
- Angkur Bolt M16	Bh	0.02	100.00%	0.023	0.00%	-	100.00%	0.023	
Total Pekerjaan Struktur Baja									
GRAND TOTAL		73.03		12.19		3.52		15.72	

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PEKERJAAN ELEKTRIKAL									
1	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu Sorot - Logo 4000k	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Solid 3000k	1.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Pattern GRC 3000k 40 Mtr @10 Mtr	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Downlight Outbow Spot 5 Watt Fasad Kisi-kisi 3000k 3 - 8 meter	0.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	3000kPengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 60 Cm	0.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 40 Cm 33000k	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pengadaan dan pemasangan traytek ladder	0.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pengadaan dan pemasangan siku penggantung 4x4 cm	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Elektrikal									
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERIKUT KELENGKAPANNYA									
1	Pegadaan dan pemasangan Lampu Sorot	0.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip Selang - Fasad Solid + Besi Siku 2mm	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Stri Selang - Fasad Pattern @10 Mtr	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fasad Kisi-kisi	0.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 60 Cm	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 40 Cm	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Panel Penerangan Fasad	0.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan berikut kelengkapannya									
PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.94	56.64%	0.532	0.00%	-	56.64%	0.532	
2	Pengadaan dan pemasangan Header Pipa PVC Aw dia 4"	0.03	100.00%	0.031	0.00%	-	100.00%	0.031	
3	Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC AW dia 1"	0.04	45.00%	0.019	0.00%	-	45.00%	0.019	
4	Pengadaan dan pemasangan Gate Valve dia 50	0.36	100.00%	0.363	0.00%	-	100.00%	0.363	
5	Pengadaan dan pemasangan Roof Tank Kap 1500 Ltr	0.28	100.00%	0.278	0.00%	-	100.00%	0.278	
6	Pompa Tansfer	0.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pompa Sirkulasi + Pengkabelan dan Perpipaian	0.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Filter + Carbon Filter	0.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Ground Tank 1m3	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bersih									
PEKERJAAN PIPA AIR BEKAS									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	0.40	59.73%	0.241	0.00%	-	59.73%	0.241	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
PEKERJAAN PIPA AIR HUJAN									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pekerjaan perbaikan kemiringan profilan air hujan	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
GRAND TOTAL		8.58		1.46		-		1.46	

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN SMK

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
		(%)		(%)		(%)		(%)	
PENYIAPAN RKK									
	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	0.01	41.11%	0.003	3.89%	0.000	45.00%	0.003	
1	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja								
	Penyiapan Formulir								
	Total Pekerjaan Penyiapan RKK								
ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI									
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0.01	100.00%	0.011	0.00%	-	100.00%	0.011	
2	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	0.07	100.00%	0.066	0.00%	-	100.00%	0.066	
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
	Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri								
ASURANSI									
1	Asuransi	0.34	100.00%	0.342	0.00%	-	100.00%	0.342	
	Total Asuransi								
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN									
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, dll)	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
2	Peralatan Pengasapan (Fogging)	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
	Total Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan								
RAMBU-RAMBU									
1	Rambu Petunjuk	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Larangan	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Peringatan	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Kewajiban	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Informasi	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
	Total Rambu-Rambu								
LAIN-LAIN									
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
2	Bendera K3	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
	Total Lain-Lain								
	Sub Total								
		0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		0.58		0.51		0.00		0.51	

LAPORAN MINGGU KE-15



**PROYEK PEMBUATAN FASADE GEDUNG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI JAKARTA
Jalan Petojo Utara VII no 8 - Jakarta**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Periode : 13 April – 19 April 2026

dilaporkan :
KONSULTAN PENGAWAS






PT. MITRA PANCA KONSULTINDO
Construction Management & Quantity Surveyor

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 1

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 13 April -19 April

1 PEK. FABRIKASI KREMONA

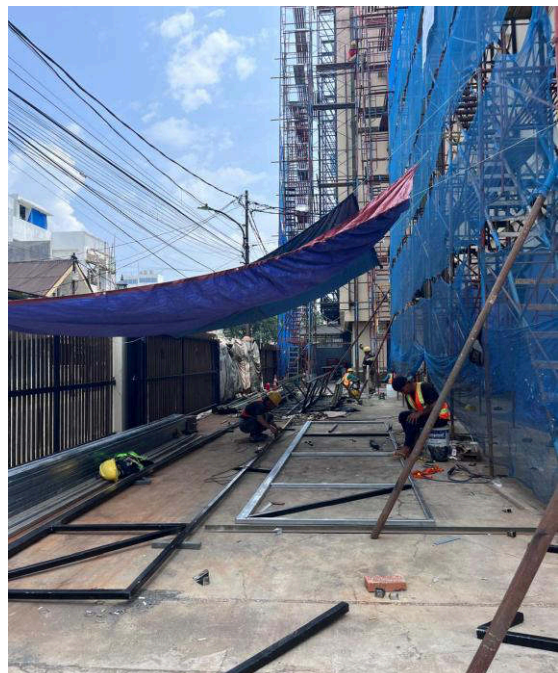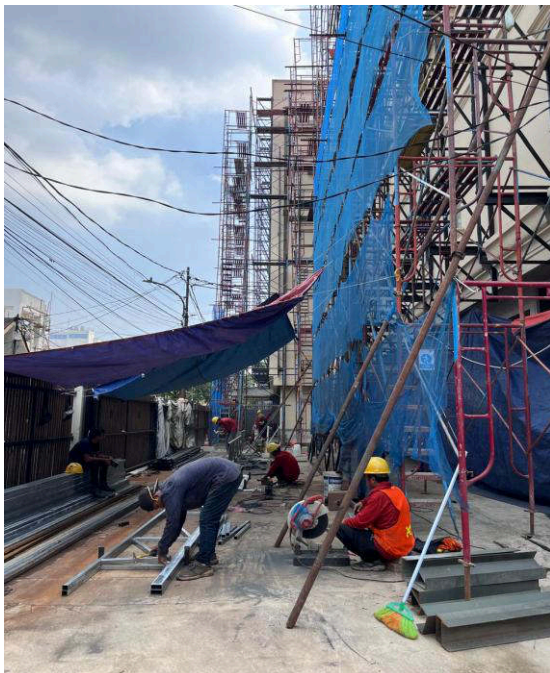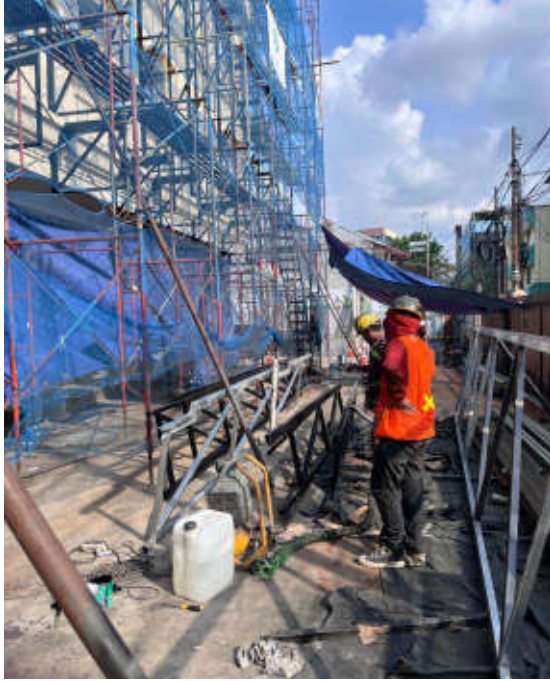


LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 2

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 13 April -19 April

1 PEK. FABRIKASI KREMONA

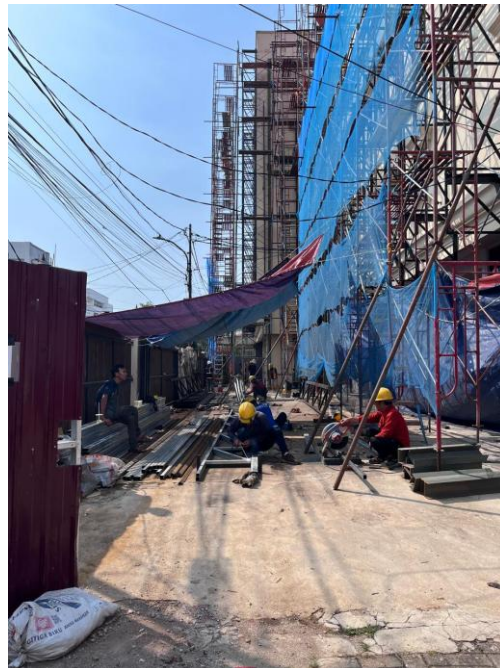

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 3

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 13 April -19 April

1 PEK.SITOUT AREA





LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 3

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 13 April -19 April

1 PEK.FABRIKASI DAN PEMASANGAN OVERSTEK KREMONA

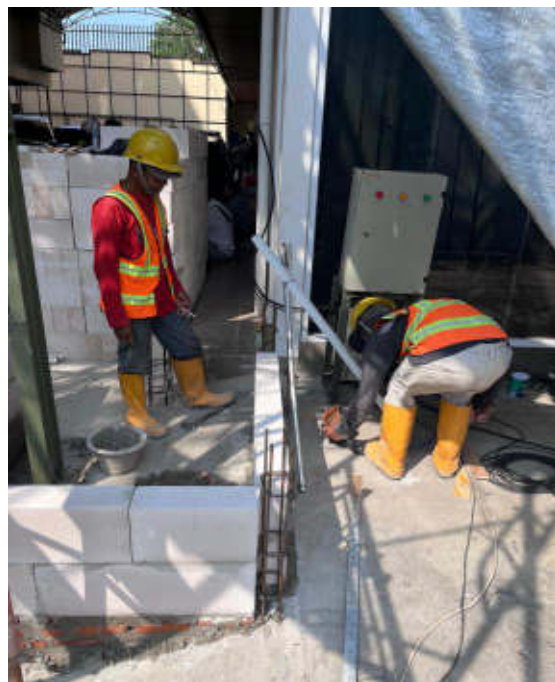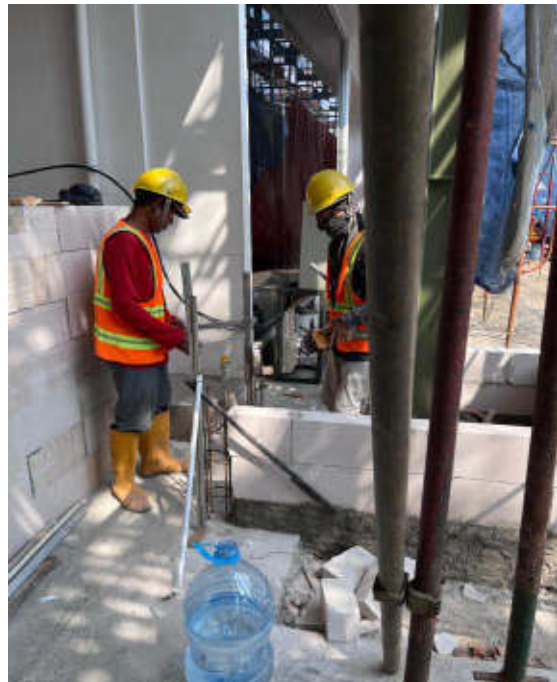


LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 3

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 13 April -19 April

1 PEK.FABRIKASI DAN PEMASANGAN OVERSTEK KREMONA

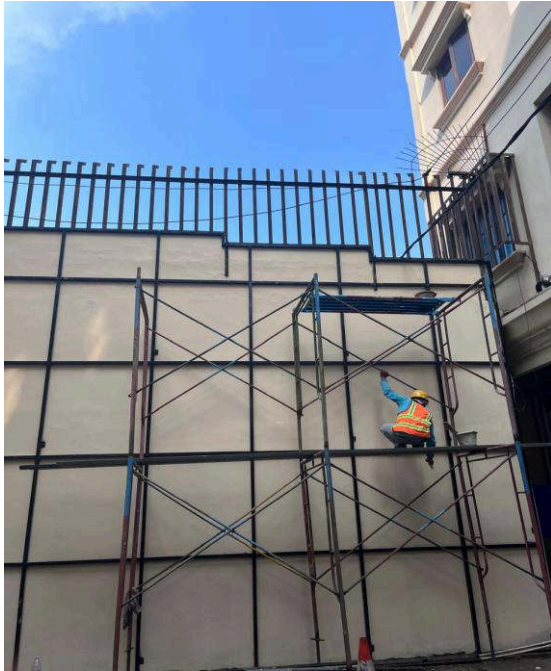

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 3

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 13 April -19 April

1 PEK.MEP




LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 3

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 13 April -19 April

1 PENGECEKAN MATERIAL ACP

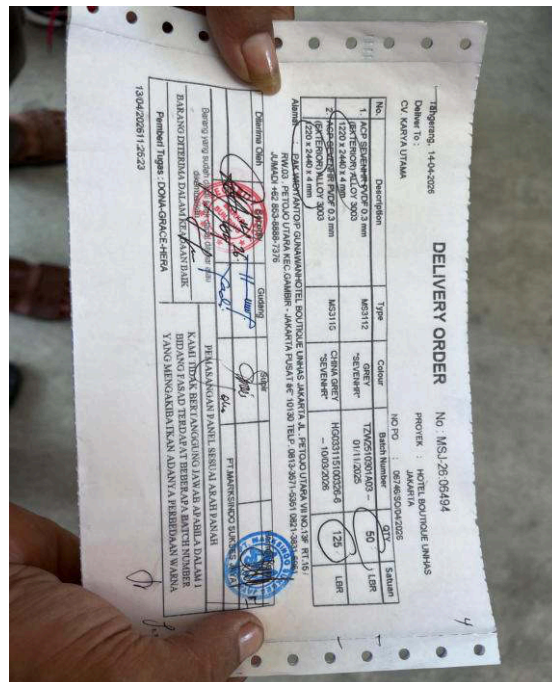

KONTRAKTOR :  CV. ALIF PUTERA PRATAMA General Contractor Jl. Delima No. 21 B, 88 Sawit Jaya		LAPORAN PROGRES MINGGUAN Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.		Owner KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN DIREKTORAT LOGISTIK / UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	
KONTRAKTOR : CV. ALIF PUTERA PRATAMA MANAJEMEN KONTRUKSI : PT. MITRA PANCA KONSULTINDO NILAI KONTRAK : Rp. 4.058.900.000,00 WAKTU PELAKSANAAN : 180 Hari Kalender		Tanggal : 13 April s.d 19 April 2026 Minggu Ke : 15 (Lima Belas) Hari Ke : 92 Sila Hari : 55			

NO	PEKERJAAN	HARGA	TOTAL	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
					Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
1	SMCK	Rp. 21,206,250.00	Rp. 21,206,250.00	0.58	88.24%	0.512	0.05%	0.000	88.29%	0.512	
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	Rp. 661,364,780.83	Rp. 661,364,780.83	17.81	14.46%	2.570	0.24%	0.043	14.70%	2.618	
3	PEKERJAAN FASAD	Rp. 2,670,486,099.31	Rp. 2,670,486,099.31	73.03	21.52%	15.716	5.48%	3.999	27.00%	19.715	
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	Rp. 313,626,232.81	Rp. 313,626,232.81	8.58	17.07%	1.464	4.40%	0.377	21.47%	1.841	
	GRAND TOTAL		Rp. 3,556,672,363.06	100.00		20.27		4.42		24.69	

Mengetahui :
OWNER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pekerjaan Persiapan dan Mobiliasi	0.41	70.00%	0.287	0.00%	-	70.00%	0.287	
2	Pembongkaran Dinding Pagar	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pembongkaran Pagar	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Persiapan									
PEKERJAAN POS JAGA									
1	Penggalian Pondasi Garis	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Urugan Kembali Bekas Galian	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pasir Urug	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Penghamparan Timbunan	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pondasi Batu Belah 1 SP : 4 PP	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pekerjaan Stoop 15x30								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Stoop	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Kolom Praktis								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Kolom	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Balok								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Balok	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
10	Pekerjaan Plat Beton								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Plat	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
11	Pekerjaan Atap								
-	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan 0,8 x 0,3 x 0,75 + Rangka Reng 0,7 x 0,4 x 0,45	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pekerjaan Atap Spandek Warna 0.4	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pekerjaan Flashing Atap	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
12	Pekerjaan Dinding								
-	Pemasangan Bata Ringan 10 cm	0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Acian Bangunan T.2mm	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
13	Pekerjaan Plafond								
-	Rangka Plafond Rangka Besi Hollow (20.40.2 + 40.40.2) 60 x 60 cm	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pemasangan Penutup Plafond Gypsum	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
14	Pekerjaan Lantai								
-	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Dinding Fin. Batu Alam	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
15	Pekerjaan Pintu Jendela								
-	Pintu Swing Uk. 90x205	0.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Jendela Geser Uk. 220x100	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
16	Pekerjaan Pengecatan								
-	Pengecatan Dinding Luar (Eksterior) Kamprot Putih	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pengecatan Dinding Dalam (Interior) Cat Putih	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pengecatan Plafond Warna Putih	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pos Jaga									

PEKERJAAN PAGAR		S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI	
1 Pekerjaan Penggalian Pondasi Garis	0.45	5.77%	0.026	0.00%	-	5.77%	0.026
2 Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	0.12	5.77%	0.007	0.00%	-	5.77%	0.007
3 Pekerjaan Urugan Pasir	0.02	23.18%	0.004	0.00%	-	23.18%	0.004
4 Pekerjaan Pasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0.13	15.45%	0.020	0.00%	-	15.45%	0.020
5 Pekerjaan Pondasi Batu Kali 1 SP : 4 PP	0.68	18.59%	0.127	0.00%	-	18.59%	0.127
6 Pekerjaan Sloof 20x35							
- Pembesian Dengan Besi Beton	0.27	9.01%	0.024	0.00%	-	9.01%	0.024
- Bekisting Sloof	0.16	19.31%	0.030	0.00%	-	19.31%	0.030
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.11	19.31%	0.022	0.00%	-	19.31%	0.022
7 Pekerjaan Kolom 15x30							
- Pembesian Dengan Besi Beton	0.24	26.83%	0.064	0.00%	-	26.83%	0.064
- Bekisting Kolom	0.37	25.12%	0.094	0.00%	-	25.12%	0.094
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.10	37.68%	0.037	0.00%	-	37.68%	0.037
8 Pekerjaan Balok							
- Pembesian Dengan Besi Beton	0.17	18.79%	0.033	0.00%	-	18.79%	0.033
- Bekisting Balok	0.15	30.90%	0.047	0.00%	-	30.90%	0.047
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.06	20.60%	0.012	0.00%	-	20.60%	0.012
9 Pekerjaan Dinding							
- Pemasangan Bata Ringan 10 cm	0.88	32.95%	0.291	0.00%	-	32.95%	0.291
- Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.84	14.76%	0.124	0.00%	-	14.76%	0.124
- Acian Dinding Pagar T.2mm	0.71	14.76%	0.104	0.00%	-	14.76%	0.104
10 Pengcatan Dinding Pagar (Eksterior) Kamprot Putih	1.31	14.76%	0.193	0.00%	-	14.76%	0.193
Total Pekerjaan Pagar							
PEKERJAAN LANSEKAP		S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI	
1 Pekerjaan Bak Tanam							
- Pemasangan Bata Ringan 10 cm	0.31	49.14%	0.151	0.00%	-	49.14%	0.151
- Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.17	73.46%	0.128	0.00%	-	73.46%	0.128
- Acian Bak Taman T.2mm	0.15	73.46%	0.108	0.00%	-	73.46%	0.108
- Pengcatan Dinding Bak Taman (Eksterior) Kamprot Hitam	0.27	30.00%	0.081	0.00%	-	30.00%	0.081
2 Penghamparan Tanah Timbunan	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3 Penanaman Rumput Jepang	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4 Penanaman Semak, Bunga kertas (Bougenvilles sp.)	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5 Penanaman Pohon Sedang, Pandan bali (Cordyline australis)	0.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6 Penanaman Pohon Sedang, Ketapang Kencana (Terminalla mantaly)	0.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7 Pekerjaan Paving Block							
- Urugan Pasir di bawah Paving Block T.10 cm	0.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Paving Block Tipe Ubin 21x21 T.8 cm	3.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8 Pekerjaan Lantai Andesit Bakar							
- Penghamparan Tanah Timbunan	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Lantai Andesit Bakar 10x10	1.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9 Pekerjaan Kursi Beton							
- Pemasangan Bata Ringan 10 cm	0.05	100.00%	0.053	0.00%	-	100.00%	0.053
- Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.07	100.00%	0.066	0.00%	-	100.00%	0.066
- Acian Bak Taman T.2mm	0.06	100.00%	0.056	0.00%	-	100.00%	0.056
- Penghamparan Tanah Timbunan	0.00	100.00%	0.004	0.00%	-	100.00%	0.004
- Penanaman Rumput Jepang	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.08	100.00%	0.079	0.00%	-	100.00%	0.079
10 Pekerjaan Pengcatan Marka Area Parkir	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11 Pekerjaan Besi Media Tanaman Rambat							
- Hollow Galvanis 4 x 4 Uk. 1,2 mm	0.23	100.00%	0.234	0.00%	-	100.00%	0.234
- Kawat Harmonika Galvanis	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12 Pemasangan Marka Titik Kumpul	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13 Pekerjaan Kanstin Beton uk. 60x21x35 cm							
- Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	21.95%	0.009	21.95%	0.009
- Bekisting Sloof	0.11	0.00%	-	21.95%	0.025	21.95%	0.025
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.04	0.00%	-	21.95%	0.009	21.95%	0.009
Total Pekerjaan Lansekap							

		S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
PEKERJAAN KANOPI							
1 Pekerjaan Kanopi Parkir							
- Hollow Gatlantis 4 x 4 Uk. 1,2 mm	0.07	95.00%	0.070	0.00%	-	95.00%	0.070
- Atap Solar Flat 3 mm	0.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Kanopi							
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL							
1 Pekerjaan Penarikan Instalasi Kabel Lampu							
- Lampu Downlight 10 watt	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Lampu Hias Tiang Taman	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2 Pekerjaan Pemasangan Lampu							
- Lampu Downlight 10 watt	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Lampu Hias Tiang Taman	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Lampu Dinding Taman	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal							
GRAND TOTAL		17.81	2.58		0.04		2.62

PEKERJAAN FASAD

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
				Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
				(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Shop drawings and As Built Drawing	Ls	0.05	45.00%	0.025	3.89%	0.002	48.89%	0.027	
2	Debris disposal	Ls	0.14	100.00%	0.137	0.00%	-	100.00%	0.137	
3	Transportation & Mobilisation	Ls	0.27	80.00%	0.219	0.00%	-	80.00%	0.219	
4	Peralatan dan perlengkapan kerja (Scaffolding dll)	Ls	2.87	97.50%	2.800	0.00%	-	97.50%	2.800	
Total Pekerjaan Pendahuluan										
PEKERJAAN PEMBONGKARAN										
1	Pembongkaran Dinding	m2	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pembongkaran Profil Luar	ls	0.07	100.00%	0.068	0.00%	-	100.00%	0.068	
3	Pembongkaran Topi Beton	m2	0.01	100.00%	0.006	0.00%	-	100.00%	0.006	
Total Pekerjaan Pembongkaran										
PEKERJAAN FASAD										
1	Rangka Utama Kremona									
	- Hollow Galvanis 40x80x2 mm	m'	1.44	85.25%	1.227	3.70%	0.053	88.95%	1.280	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	3.15	85.25%	2.688	3.70%	0.117	88.95%	2.805	
	- Overstek Baja UNP 150x75x5,1 mm	m'	0.96	85.25%	0.819	3.70%	0.036	88.95%	0.854	
	- Dynabolt M12 x75 mm	bh	0.08	85.25%	0.071	3.70%	0.003	88.95%	0.074	
2	Fasad ACP Solid Dark Grey									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Grey Grey	m2	12.38	10.00%	1.238	14.16%	1.753	24.16%	2.991	
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm China Grey	m2	6.39	10.00%	0.639	14.36%	0.918	24.36%	1.557	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.17	10.00%	0.117	1.80%	0.021	11.80%	0.138	
3	Fasad ACP Kisi-kisi Red									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Red	m2	20.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 20x40x2 mm	m'	4.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Fasad ACP Bak Tanam									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm China Grey	m2	1.88	10.00%	0.188	20.00%	0.377	30.00%	0.565	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.19	10.00%	0.119	0.31%	0.004	10.31%	0.123	
5	Fasad ACP Pattern									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Yellow	m2	1.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	0.61	0.00%	-	15.38%	0.094	15.38%	0.094	
6	Signage Logo & Text UNHAS Uk. 2920x1890 mm									
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Signage Logo & Text HADIN Uk. 3200x1710 mm		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Finishing									
	- Pekerjaan Pengecatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	3.29	70.00%	2.300	18.95%	0.623	88.95%	2.923	
	- Pekerjaan Pengecatan Signage Logo UNHAS	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pekerjaan Pengecatan Signage Logo HADIN	m2	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Kanopi & Plafon WPC Bar									
	- Solar Tuff Dark Grey Transparan T. 8 mm	m2	0.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x80x1,4 mm	m'	0.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x1,4 mm	m'	0.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- WPC Bar Click On 50x90 mm	m'	5.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Tali Sling M20 (Ke Balok Gedung Eksisting)	m'	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pengecatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Fasad										
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA										
1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Poer	m3	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	m3	0.01	100.00%	0.006	0.00%	-	100.00%	0.006	
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	0.00	100.00%	0.001	0.00%	-	100.00%	0.001	
4	Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P1)									

- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	100.00%	0.013	0.00%	-	100.00%	0.013	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.03	100.00%	0.026	0.00%	-	100.00%	0.026	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.04	100.00%	0.037	0.00%	-	100.00%	0.037	
5 Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P2)									
- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	100.00%	0.009	0.00%	-	100.00%	0.009	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.02	100.00%	0.020	0.00%	-	100.00%	0.020	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
6 Pekerjaan Kolom Pedestal (20x20)									
- Bekisting Kolom	m2	0.01	100.00%	0.015	0.00%	-	100.00%	0.015	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.01	100.00%	0.014	0.00%	-	100.00%	0.014	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.00	100.00%	0.004	0.00%	-	100.00%	0.004	
7 Pekerjaan Struktur Baja									
- WF 150 x 75 x 5 x 7	kg	1.91	100.00%	1.911	0.00%	-	100.00%	1.911	
- Base Plate t=12 mm	kg	0.21	100.00%	0.210	0.00%	-	100.00%	0.210	
- Baut M16 x 1 Nut + 2 Washer	Bh	0.71	100.00%	0.707	0.00%	-	100.00%	0.707	
- Angkur Bolt M16	Bh	0.02	100.00%	0.023	0.00%	-	100.00%	0.023	
Total Pekerjaan Struktur Baja									
GRAND TOTAL		73.03		15.72		4.00		19.72	

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
		(%)	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)		
PEKERJAAN ELEKTRIKAL									
1	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu Sorot - Logo 4000k	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Solid 3000k	1.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Pattern GRC 3000k 40 Mtr @10 Mtr	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Downlight Outbow Spot 5 Watt Fasad Kisi-kisi 3000k 3 - 8 meter	0.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	3000kPengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 60 Cm	0.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 40 Cm 33000k	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pengadaan dan pemasangan traytek ladder	0.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pengadaan dan pemasangan siku penggantung 4x4 cm	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Elektrikal									
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERIKUT KELENGKAPANNYA									
1	Pegadaan dan pemasangan Lampu Sorot	0.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip Selang - Fasad Solid + Besi Siku 2mm	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Stri Selang - Fasad Pattern @10 Mtr	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fasad Kisi-kisi	0.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 60 Cm	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 40 Cm	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Panel Penerangan Fasad	0.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan berikut kelengkapannya									
PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.94	56.64%	0.532	0.00%	-	56.64%	0.532	
2	Pengadaan dan pemasangan Header Pipa PVC Aw dia 4"	0.03	100.00%	0.031	0.00%	-	100.00%	0.031	
3	Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC AW dia 1"	0.04	45.00%	0.019	55.00%	0.023	100.00%	0.041	
4	Pengadaan dan pemasangan Gate Valve dia 50	0.36	100.00%	0.363	0.00%	-	100.00%	0.363	
5	Pengadaan dan pemasangan Roof Tank Kap 1500 Ltr	0.28	100.00%	0.278	0.00%	-	100.00%	0.278	
6	Pompa Tansfer	0.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pompa Sirkulasi + Pengkabelan dan Perpipaan	0.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Filter + Carbon Filter	0.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Ground Tank 1m3	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bersih									
PEKERJAAN PIPA AIR BEKAS									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.32	0.00%	-	62.76%	0.199	62.76%	0.199	
2	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	0.40	59.73%	0.241	38.40%	0.155	98.12%	0.396	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
PEKERJAAN PIPA AIR HUJAN									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pekerjaan perbaikan kemiringan profilan air hujan	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
GRAND TOTAL		8.58		1.46		0.38		1.84	

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN SMK

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
		Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot		
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
PENYIAPAN RKK									
	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	0.01	45.00%	0.003	3.89%	0.000	48.89%	0.003	
1	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja								
	Penyiapan Formulir								
Total Pekerjaan Penyiapan RKK									
ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI									
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0.01	100.00%	0.011	0.00%	-	100.00%	0.011	
2	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	0.07	100.00%	0.066	0.00%	-	100.00%	0.066	
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri									
ASURANSI									
1	Asuransi	0.34	100.00%	0.342	0.00%	-	100.00%	0.342	
Total Asuransi									
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN									
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, dll)	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
2	Peralatan Pengasapan (Fogging)	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan									
RAMBU-RAMBU									
1	Rambu Petunjuk	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Larangan	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Peringatan	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Kewajiban	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Informasi	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
Total Rambu-Rambu									
LAIN-LAIN									
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
2	Bendera K3	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Lain-Lain									
Sub Total									
		0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
		0.58		0.51		0.00		0.51	

KURVA S

JADWAL PEKERJAAN
 : Pembangunan Gedung Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) UNHAS
 LOKASI : Jl. Pahlawan Uluh No. 8, RT. 150/13, Pahlawan Uluh, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10130
 TAHUN ANGGARAN : 2023
 DURASI : 180 HK

No	URAIAN PEKERJAAN	BOROS (%)	DURASI (Hr)	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MAY				JUN				JULI				KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Minggu ke-1 01-11	Minggu ke-2 12-18	Minggu ke-3 19-25	Minggu ke-4 26-01	Minggu ke-5 02-08	Minggu ke-6 09-15	Minggu ke-7 16-22	Minggu ke-8 23-01	Minggu ke-9 02-08	Minggu ke-10 09-15	Minggu ke-11 16-22	Minggu ke-12 23-01	Minggu ke-13 02-08	Minggu ke-14 09-15	Minggu ke-15 16-22	Minggu ke-16 23-01	Minggu ke-17 02-08	Minggu ke-18 09-15	Minggu ke-19 16-22	Minggu ke-20 23-01	Minggu ke-21 02-08	Minggu ke-22 09-15	Minggu ke-23 16-22	Minggu ke-24 23-01	Minggu ke-25 02-08	Minggu ke-26 09-15	Minggu ke-27 16-22	Minggu ke-28 23-01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	PEKERJAAN BROS	0.01	1.00	0.0077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

LAPORAN MINGGU KE-16



**PROYEK PEMBUATAN FASADE GEDUNG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI JAKARTA
Jalan Petojo Utara VII no 8 - Jakarta**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Periode : 20 April – 26 April 2026

dilaporkan :
KONSULTAN PENGAWAS



PT. MITRA PANCA KONSULTINDO
Construction Management & Quantity Surveyor

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 1

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 20 April -26 April

1 PEK. FABRIKASI DAN PEMASANGAN KREMONA

